

证书等级：★★★★

ISO9001:2015 质量体系认证

证书编号：水保监测(鄂)字第 20220006 号

注册号：23921Q00089R0S

宜昌城区（点军区段）长江岸坡生态治理工程

水土保持监测季度报告表

（2023 年第 1 季度）



建设单位：宜昌市三峡二期水环境综合治理有限责任公司

编制单位：湖北绿源工程设计有限公司

2024年4月



生产建设项目水土保持监测单位水平评价证书
(副本)

单位名称：湖北绿源工程设计有限公司

法定代表人：张艳艳

单位等级：★★★★(4星)

证书编号：水保监测(鄂)字第 20220006 号

有效期：自 2022 年 12 月 01 日至 2025 年 11 月 30 日

发证机构：中国水土保持学会

发证时间：2022 年 12 月



项目名称：宜昌城区（点军区段）长江岸坡生态治理工程

文件类型：水土保持监测季度报告表

编制单位：湖北绿源工程设计有限公司（签章）

法定代表人：（签章）

单位地址：宜昌高新区发展大道 57 号 6 栋 2 单元 9001 号

联系方式：13308600175 0717-6299982

**宜昌城区（点军区段）长江岸坡生态治理工程
水土保持监测季度报告表**

责任页

湖北绿源工程设计有限公司

批 准：张艳艳（总经理）

核 定：晏继杰（总工程师）

审 查：毛广维（工程师）

校 核：赵江鹏（工程师）

项目负责人：王玉姣（工程师）

编 写：王玉姣（工程师）

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2023年2月1日至2023年3月31日						
项目名称		宜昌城区（点军区段）长江岸坡生态治理工程				
建设单位联系人及电话		黄胜元/15827192509	监测项目负责人 (签字)：	建设单位（盖章）：		
填表人及电话		王玉姣/15727177267				
主体工程进度		<p>本季度（2023年2月~2023年3月）主体工程主要进度为：</p> <p>1、岸坡治理区 本季度主要对纱帽山观景平台外侧岸坡进行修整等工作，目前岸坡已基本成型，新增扰动面积2.36hm²。截止于2023年3月，已完成主体工程进度的6%。</p> <p>2、交通设施区 本季度主要对礅石子沟桥至至喜长江大桥桥底进行原绿道路面破除，新增扰动面积约1.49hm²。截止于2023年3月，已完成主体工程进度的10%。</p> <p>3、绿地区 本季度主要对纱帽山观景平台处进行场地平整，新增扰动掉面积1.57hm²。截止于2023年3月，已完成主体工程进度的4%。</p> <p>4、施工场地区 本季度在至喜长江大桥北侧布设1处施工场地区，主要用于堆放材料等，新增扰动面积0.08hm²。</p> <p>5、临时堆土场区 本季度临时堆土场新增扰动地表面积0.23hm²，主要用于堆放项目区内剥离的表土，现阶段堆放表土约0.51万m³，施工过程中路面破除产生的土石方已由施工单位运往小韦家湾消纳场进行集中处理。</p>				
		指标	设计总量	本季度新增	累计	
		合计		207.55	7.20	7.20
扰动土地面积 (hm ²)	主体工程区	坡岸治理区		13.75	2.36	2.36
		交通设施区		13.87	3.19	3.19
		绿地区		55.75	1.57	1.57
		保留区		123.00		
	施工场地区		0.48 (0.88)	0.08	0.08	
	临时堆土场区		(7.70)	(0.23)	(0.23)	
	施工便道区		0.70 (2.10)			
		临时堆土场数量（个）		5	1	1
		DT-1 临时堆土场（万m ³ ）		5.52	0.51	0.51
		DT-2 临时堆土场（万m ³ ）		3.15		
		DT-3 临时堆土场（万m ³ ）		1.68		
		DT-4 临时堆土场（万m ³ ）		2.72		
		DT-5 临时堆土场（万m ³ ）		3.66		
项	主体	坡岸	植物措施	植草护坡（hm ² ）	2.15	

目 分 区	工程 区	治理 区		植生块 (hm ²)	11.60		
				棕榈石 (hm ²)	2.15		
			临时措施	临时苫盖 (hm ²)	5.15	0.37	0.37
				临时排水沟 (m)	8530		
				临时沉砂池 (个)	2		
				临时拦挡 (m)	9850		
		泥浆池 (个)		1			
		交通 设施 区	工程措施	截水沟 (m)	2237		
				排水沟(m)	1399		
			植物措施	植草护坡 (hm ²)	5.07		
				行道树 (棵)	3400		
			临时措施	临时苫盖 (hm ²)	5.25		
	临时排水沟 (m)			8590			
	临时沉砂池 (个)			1	1	1	
	临时拦挡 (m)			2580			
	泥浆池 (个)			1			
	绿地区		工程措施	表土剥离 (万 m ³)	16.73	0.51	0.51
		表土回覆 (万 m ³)		16.73			
		土地整治 (hm ²)		55.75			
		雨水排水管 (m)		5402			
		植物措施	种植乔木 (棵)	14940			
			种植地被 (hm ²)	55.75			
			种植湿生 (hm ²)	26.32			
			三维网植草 (hm ²)	1.48			
		临时措施	临时苫盖 (hm ²)	14.75	0.26	0.26	
			临时排水沟 (m)	28690			
			临时沉砂池 (个)	7			
			临时拦挡 (m)	11070			
		施工便道区	工程措施	清除硬化层 (万 m ³)	0.28		
			临时措施	临时撒播草籽 (hm ²)	0.52		
	临时排水沟 (m)			5600			
	临时沉砂池 (个)			4			
	施工场地区	工程措施	清除硬化层 (万 m ³)	0.14			
临时措施		临时苫盖 (hm ²)	1.10				
		临时排水沟 (m)	490				
		临时沉砂池 (个)	5				
临时堆土场区	临时措施	临时拦挡 (m)	228				
		临时苫盖 (hm ²)	8.00	0.15	0.15		

		临时排水沟 (m)	2630	164	164
		临时沉砂池 (个)	5	1	1
		临时拦挡 (m)	2550	64	64
水土流失影响因子	降雨量 (mm)		80.50		
	最大 24 小时降雨 (mm)		15.50mm (2 月 8 日)		
	最大风速 (m/s)		2.40		
	月平均气温 (℃)		9.70		
水土流失量 (t)	173.40				
水土流失灾害事件	无				
存在问题与建议	本项目现阶段正处于施工初期, 施工现场紧邻长江, 建议施工过程中及时布设拦挡等防护措施, 避免泥沙流入长江。				

1 主体工程形象进度

1.1 主体工程建设规模

项目地点：宜昌市点军区

地形地貌：低山丘陵地貌

项目建设性质：新建

规模：主要包括生态护岸工程，景观绿化工程，防汛道路工程，沿江截污工程以及配套工程。

1、生态护岸工程：以崩岸治理为基本内容，稳固滨江岸线约 10.40km。

2、景观绿化工程：范围北起葛洲坝坝下，南至艾家荆门山，生态治理岸坡长度 21.5km，总面积约 206.37hm²。主要包括景观总体方案、景观节点方案、山坡绿化工程、绿道工程、场地铺装工程、配套项目的建设等。

3、防汛道路工程包括 1#、2#、3#共三条沿江防汛道路，总长约 6.70km，均为沥青混凝土路面，含桥梁两座。

4、沿江截污工程涉及 D300-D1200 污水干管约 7.60km。根据工程特点，将工程沿长江岸线划分为 2 个区段进行建设，第 1 段为 K0+300 ~ K9+650（即葛洲坝至红光港机厂处）；第 2 段为 K9+650 ~ K21+500（即红光港机厂至中石化油库处）。

工程投资：项目总投资为 93861.88 万元，其中土建投资 72621.71 万元

开工时间：2023 年 2 月开工建设

完工时间：2025 年 12 月完工

水土保持监测委托时间：2024 年 4 月

建设单位：宜昌市三峡二期水环境综合治理有限责任公司

施工单位：中国水利水电第四工程局有限公司

中国铁建大桥工程局集团有限公司

监理单位：湖北中业宏工程咨询有限公司

设计单位：长江勘测规划设计研究有限责任公司

水土保持监测单位：湖北绿源工程设计有限公司。

1.2 主体工程形象进度

本水土保持监测期为：2023年2~3月（第1季度）。本季度主要对礅石子沟桥至至喜长江大桥桥底原绿道破除及岸坡修整等工作。

1、岸坡治理区

本季度主要对纱帽山观景平台外侧岸坡进行修整等工作，目前岸坡已基本成型，新增扰动面积2.36hm²。截止于2023年3月，已完成主体工程进度的6%。

2、交通设施区

本季度主要对礅石子沟桥至至喜长江大桥桥底进行原绿道路面破除，新增扰动面积约1.49hm²。截止于2023年3月，已完成主体工程进度的10%。

3、绿地区

本季度主要对纱帽山观景平台处进行场地平整，新增扰动掉面积1.57hm²。截止于2023年3月，已完成主体工程进度的4%。

4、施工场地区

本季度在至喜长江大桥北侧布设1处施工场地区，主要用于堆放材料等，新增扰动面积0.08hm²。

5、临时堆土场区

本季度临时堆土场新增扰动地表面积0.23hm²，主要用于堆放项目区内剥离的表土，现阶段堆放表土约0.51万m³，施工过程中路面破除产生的土石方已由施工单位运往小韦家湾消纳场进行集中处理。

项目区现阶段正处于施工初期，现场主要进行施工准备工作及路面破除，局部区域进行场地平整，现场裸露区域较多，受以上因素影响，其水土流失量总体较施工前期呈上升趋势。故需加强水土保持防护措施，最大限度地减少项目区水土流失。本季度无重大水土流失事件发生，水土流失程度总体可控。

2 本期影响水土流失重要因子及状况

2.1 气象因子

根据宜昌市气候资料统计，2~3 月份降水较同年减少，最大 24 小时降雨量为 15.50mm（2 月 8 日），降雨主要集中在 2 月，平均气温接近常年，极端最高气温 30℃，极端最低气温-2℃。

表 2-1 项目区气象情况一览表

水土流失影响因子	降雨量（mm）	80.50
	最大 24 小时降雨（mm）	15.50mm（2 月 8 日）
	最大风速（m/s）	2.40
	月平均气温（℃）	9.70

2.2 本期扰动土地变化情况

根据批复的项目水土保持方案报告书，本项目水土保持防治责任范围总计 207.55hm²，截止 2023 年 3 月底，根据现场调查及查阅施工资料，施工严格按设计文件布置，未出现超范围占地现象。

本季度地表扰动情况如下：

岸坡治理区：本季度主要对岸坡进行边坡修整，新增扰动面积 2.36hm²。截止于 2023 年 3 月，累计扰动面积共 2.36hm²；

交通设施区：本季度主要对绿道进行路面破除，新增扰动面积约 3.19hm²。截止于 2023 年 3 月，累计扰动面积共 3.19hm²；

绿地区：本季度主要对纱帽山光景平台区域进行场地平整，新增扰动面积 1.57hm²。截止于 2023 年 3 月，累计扰动面积共 1.57hm²；

保留区：本季度区域内暂未动工。截止于 2023 年 3 月，累计扰动面积共 0hm²；

施工场地区：本季度在至喜长江大桥北侧布设 1 处施工场地区，主要用于堆放材料等，新增扰动面积 0.08hm²。截止于 2023 年 3 月，累计扰动面积 0.08hm²；

临时堆土场区：本季度临时堆土场主要用于堆放项目区表土，新增扰动面积 0.23hm²。截止于 2023 年 3 月，累计扰动面积共 0.23hm²；

施工便道区：本季度施工区域周边交通便利，无需设置施工便道。截止于 2023 年 3 月，累计扰动面积 0hm²。

本期扰动土地变化情况（见表 2-2）。

表 2-2 本季度（2023 年 2 月~3 月）扰动土地变化情况表

水土保持防治分区		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 (hm ²)	合计	207.55	7.20	7.20	
	主体工程区	坡岸治理区	13.75	2.36	2.36
		交通设施区	13.87	3.19	3.19
		绿地区	55.75	1.57	1.57
		保留区	123		
	施工场地区	0.48 (1.36)	0.08	0.08	
	临时堆土场区	(7.70)	(0.23)	(0.23)	
	施工便道区	0.70 (1.36)			

2.3 土石方挖填动态

经查阅施工资料，本季度主要建设内容为对现有绿道进行路面破除。截止本季度末本项目已累计完成工程土石方开挖 2.31 万 m³（其中表土 0.51 万 m³，土石方 1.80 万 m³），主要为绿道破除产生的硬化层及剥离的表土等，累计回填土石方 0.84 万 m³，累计产生弃方 0.96 万 m³，弃方由施工单位运往小韦家湾消纳场进行集中处理。

表 2-3 土石方变化动态监测表

分类		设计总量	上季度累计	本季度新增	本季度累计
开挖土石方 (万 m ³)	土石方	30.23		1.80	1.80
	表土	16.73		0.51	0.51
	小计	46.96		2.31	2.31
回填土石方 (万 m ³)	土石方	54.22		0.84	0.84
	表土	16.73			
	小计	70.95			0.84
临时堆土		16.73		0.51	0.51
弃土		5.34		0.96	0.96

2.4 水土保持防护措施因子

本项目水保监测工作于 2024 年 4 月开始，项目预计 2025 年 12 月完工。根据施工单位报表和监理单位统计，结合本季度水土保持监测现场调查数据，截止 2023 年 3 月底，本季度主要对现场进行施工准备工作及对礅石子沟桥至至喜长江大桥桥底进行原绿道路面破除。

本季度（2023 年 2 月~2023 年 3 月）新增水保措施主要为表土剥离、临时

苫盖、临时沉砂池、临时排水沟及临时拦挡等。

水土保持防护措施基本与工程进度同步布置,有效地减缓了本季度水土流失量。

表 2-4 水土保持防护措施情况表

防护措施	措施类型	单位	设计量	本季完成	累计完成
工程措施	表土剥离	万 m ³	16.73	0.51	0.51
	表土回覆	万 m ³	16.73		
	土地整治	hm ²	55.75		
	雨水排水管	m	5402		
	截水沟	m	2237		
	排水沟	m	1399		
	清除硬化层	万 m ³	0.42		
植物措施	植草护坡	hm ²	7.22		
	植生块	hm ²	11.6		
	棕榈石	hm ²	2.15		
	行道树	棵	3400		
	种植乔木	棵	14940		
	种植地被	hm ²	55.75		
	种植湿生	hm ²	26.32		
三维网植草	hm ²	1.48			
临时措施	临时苫盖	hm ²	34.25	0.78	0.78
	临时排水沟	m	54530	164	164
	临时沉砂池	个	24	2	2
	临时拦挡	m	27778	64	64
	泥浆池	个	2		
	临时撒播草籽	hm ²	0.52		

3 本期土壤侵蚀强度和流失量测算

3.1 本期土壤侵蚀强度

根据监测样区的水土流失量取值,结合监测样区地形地貌与其它施工区域的地形地貌的比较参数,以及本监测期降雨量情况、施工阶段、施工强度等系数,分析各分区土壤侵蚀级别和平均土壤侵蚀模数,最终修订本监测期各区平均土壤侵蚀模数(见表3-1)。

表 3-1 本期项目区土壤侵蚀级别和模数修订值

水土保持防治分区		累计扰动面积(hm ²)	土壤侵蚀级别	土壤侵蚀监测模数 t/(km ² ·a)	土壤侵蚀修订值模数 t/(km ² ·a)	
土壤侵蚀强度及模数	合计	7.20				
	主体工程区	岸坡治理区	2.36	中度~强烈	4620~5510	4850
		交通设施区	3.19	轻度	1680~1920	1820
		绿地区	1.34	中度~强烈	4570~5500	4993
		保留区	0	微度	426~488	456
	施工场地区	0.08	轻度	793~942	853	
	临时堆土场区	0.23	强烈	5155~5623	5347	
	施工便道区	0	微度	468~510	479	

3.2 水土流失量推算

本项目现处于初期阶段,主要对现场进行绿道破除及岸坡修整等工作,现场施工造成裸露区域较多,施工期间已扰动区域产生水土流失量较施工前逐步增加,现场水土流失状态处于微度~强烈,根据各分区侵蚀强度计算得出本季度水土流失量 173.40t。

表 3-2

本季度项目水土流失量表

项目分区		扰动区域面积 (hm ²)	未扰动区域面积 (hm ²)	扰动后土壤侵蚀强度 t/(km ² ·a)	土壤侵蚀背景模数 t/(km ² ·a)	流失时间 (a)	扰动区域水土流失量 (t)	未扰动区域水土流失量 (t)	合计 (t)
主体工程区	岸坡治理区	2.36	11.39	4950	403	0.17	19.47	7.65	27.12
	交通设施区	3.19	7.7	1820	384	0.17	9.68	4.93	14.60
	绿地区	1.34	46.71	4893	374	0.17	10.93	29.12	40.04
	保留区	0	123	456	382	0.17	0.00	78.31	78.31
施工场地区		0.08	1.28	853	415	0.17	0.11	0.89	1.00
临时堆土场区		0.23	7.47	5347	600	0.17	2.05	7.47	9.52
施工便道区		0	2.80	479	600	0.17	0.00	2.80	2.80
合计		7.20	200.35				40.19	131.16	173.40

3.3 本期水土流失分析

本项目于 2023 年 2 月份开工，截止 2023 年 3 月底，仅礅石子沟桥至至喜长江大桥已开工建设，余下区域均为原地貌。

1、岸坡治理区

本季度纱帽山观景平台外侧岸坡进行修整，造成现场裸露区域较多，故土壤侵蚀级别为中度~强烈，平均侵蚀模数 4950t/（km²·a）。

2、交通设施区

本季度主要对礅石子沟桥至至喜长江大桥桥底原绿道进行路面破除，其余区域暂未开工建设，且已开工区域周边均已进行硬化，故土壤侵蚀级别为轻度，平均侵蚀模数 1820/（km²·a）。

3、绿地区

本季度纱帽山观景平台外侧进行场地平整，现场土方较为松散，故土壤侵蚀级别为中度~强烈，平均侵蚀模数 4893t/（km²·a）。

4、保留区

本项目保留区主要区域内暂未动工，现场为原地貌，故土壤侵蚀级别为微度，平均侵蚀模数 456t/（km²·a）。

5、施工场地区

本项目共布设 1 处施工场地，施工场地现场已铺设碎石，施工期间水土流失量较少，故土壤侵蚀级别为轻度，平均侵蚀模数 853t/（km²·a）。

6、临时堆土场区

本季度临时堆土场区域内布设了临时排水沟等措施，并对坡面进行了临时苫盖，但临时堆土土方较为松散，故该区土壤侵蚀级别为强烈，平均侵蚀模数 5347t/（km²·a）。

7、施工便道区

本季度施工区域周边交通便利，暂未设置施工便道，故该区土壤侵蚀级别为微度，平均侵蚀模数 479t/（km²·a）。

根据水土侵蚀监测结果，本季度正处于施工初期，现场裸露区域较施工准备

期逐渐增加,施工过程中需加强临时苫盖及排水等措施,以减少项目区水土流失。

4 问题及建议

1、本项目现阶段正处于施工初期，施工现场紧邻长江，建议施工过程中及时布设拦挡等防护措施，避免泥沙流入长江。

2、及时向宜昌市点军区税务局缴纳水土保持补偿费 311.325 万元。

上述建议，请建设单位给予重视。

5 本期水土保持工作情况

按生产建设项目水土保持监测规程和本工程水土保持方案要求，我单位于 2024 年 4 月 12 日对项目现场进行全面监测，在此基础上，通过对施工单位提供的相关资料及现场踏勘情况，最终完成本期监测报告。水土保持监测主要工作为：

1、实地查勘和查阅施工资料及项目区影像资料，对已实施水土保持措施规格、数量进行复核统计。

2、根据收集整理的水土保持相关资料与建设单位、监理单位、施工单位进行对接。

6 本期该工程水土保持评价指标及赋分表


根据水利部办公厅办水保[2020]161号《关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》精神，本监测期水土保持监测三色评价指标及赋分结论为黄色。

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

监测时段和防治责任范围		2023年第1季度，207.55公顷		
三色评价结论（勾选）		绿色 <input type="checkbox"/> 黄色 <input checked="" type="checkbox"/> 红色 <input type="checkbox"/>		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动土地情况	扰动范围控制	15	15	施工过程中施工单位未擅自扩大施工扰动面积，不扣分
	表土剥离保护	5	5	本项目剥离的表土已堆放至临时堆土场进行存放，不扣分
	弃土（石、渣）堆放	15	15	未在水土保持方案确定的专门存放地外新设弃渣场，没有乱堆、乱弃的现象，不扣分
水土流失状况		15	14	经估算，本期水土流失量为173.40t，约107.50m ³ ，扣1分
水土流失防治成效	工程措施	20	20	项目区正处于施工初期，不存在工程措施不完善区域，不扣分
	植物措施	15	0	项目已施工区域未及时落实植物措施，扣15分
	临时措施	10	3	区域内临时拦挡及临时苫盖等不完善7处，扣7分
水土流失危害		5	5	未发生水土流失危害，不扣分
合计		100	77	

7 本期监测影像及监测记录附表

7.1 监测影像

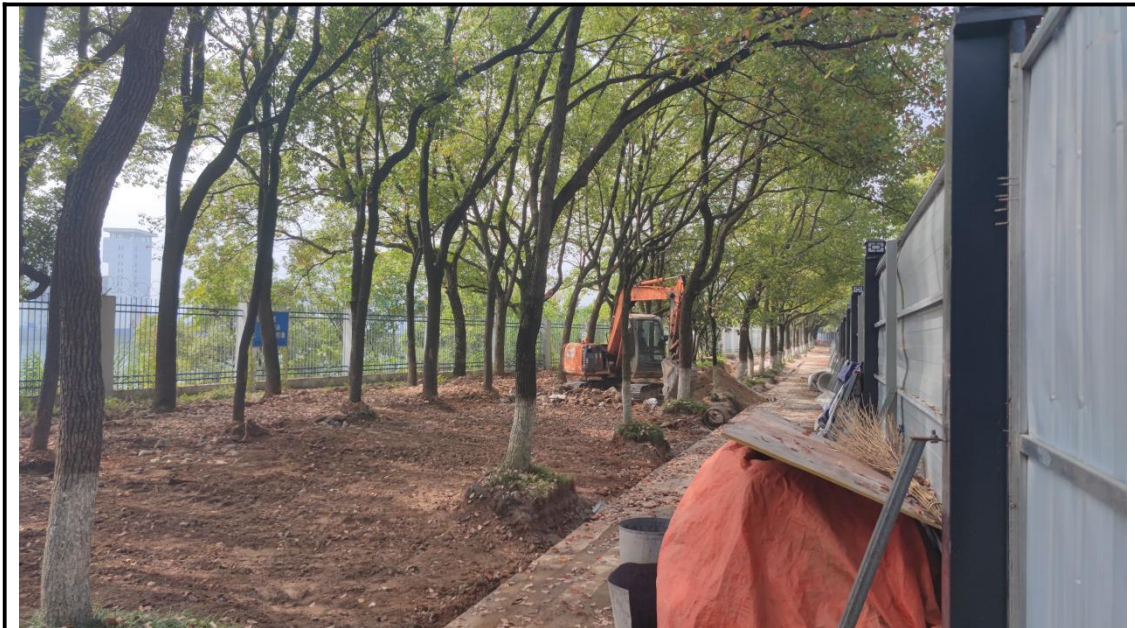

原绿道破除（2023年3月）



临时苫盖（2023年3月）



临时沉砂池（2023年3月）



岸坡修整（2023年3月）



施工场地区（2023年3月）

7.2 监测记录表

附表 1 生产建设项目工程建设区域及其分区面积统计表

工程建设区域及其分区		面积 (hm ²)	实施单位
一级分区	二级分区		
宜昌城区 (点军区段) 长江岸坡生态治理工程	主体工程区	206.37	宜昌市三峡二期水环境综合治理有限责任公司
	施工场地区	0.48 (0.88)	
	临时堆土场区	(7.70)	
	施工便道区	0.70 (2.10)	
合计		207.55	
说明: 1、工程建设区域分区的数量和级别应根据项目情况确定。			
2、“面积”栏按照分区级别从高级别向低级别逐级分解或从低级别向高级别逐项汇总的方式记录和统计, 如该栏中第一、第二、第三、第四行的示例。			
3、“实施单位”填写对应分区的施工、建设或使用单位的名称。			

附表 2

扰动土地情况监测记录表

单位: hm²

编号	监测日期	监测分区	扰动情况			整治情况				现场情况
			扰动形式	扰动面积	扰动前土地利用类型	整治方式	整治面积	累计整治面积	整治后土地利用类型	
1	2024年4月12日	坡岸治理区	挖填	13.75	水域及水利设施用地、其他用地					对边坡进行削坡整形
2		交通设施区	占压	13.87	交通运输用地、其他用地					正在对路面进行破除
3		绿地区	占压	55.75	耕地、其他用地					正在进行场地平整工作
4		保留区	占压	123	耕地、园地、林地、其他用地					
5		施工场地区	占压	0.48 (0.88)	其他用地					已铺设碎石垫层
6		临时堆土场区	占压	(7.70)	其他用地					堆放项目区表土
7		施工便道区	占压	0.70 (2.10)	其他用地					
合计				207.55						

填表说明: 1、扰动形式主要有挖填、占压;

2、土地利用类型按照 GB/T21010-2017 一级分类填写, 主要包括耕地、园地、林地、草地、交通运输用地等;

3、整治方式主要有硬化、土地整治、植物措施等。

附表 3

水土流失面积记录表

项目分区	面积 (hm ²)					
	分区面积	本季度扰动面积	累计扰动面积	本季度治理面积	累计整治面积	水土流失面积
坡岸治理区	13.75	2.36	2.36			13.75
交通设施区	10.89	3.19	3.19			10.89
绿地区	48.05	1.57	1.57			48.05
保留区	123					123
施工场地区	1.36	0.08	0.08			1.36
临时堆土场区	7.70	0.23	0.23			7.70
施工便道区	2.80					2.80
合计	207.55	7.43	7.43			207.55

附表 4

工程措施监测记录表

监测日期	监测分区		措施类型	开工日期	完成日期	单位	数量	运行状况	防治效果
2024年4月12日	主体工程区	绿地区	表土剥离	2023年2月26日	2023年3月8日	万 m ³	0.51	良好	有效的保护了表土资源，提高植被绿化存活率

附表 5

临时措施监测记录表

监测日期	监测分区		措施类型	开工日期	完成日期	单位	数量	运行状况	防治效果
2024年4月12日	主体工程区	坡岸治理区	临时苫盖	2023年3月12日	2023年3月18日	hm ²	0.37	良好	防止雨水冲刷
		交通设施区	临时沉砂池	2023年3月20日	2023年3月20日	座	1		沉淀雨水中的泥沙
		绿地区	临时苫盖	2023年3月24日	2023年3月26日	hm ²	0.26		防止雨水冲刷
	临时堆土场区		临时苫盖	2023年3月15日	2023年3月15日	hm ²	0.15		防止雨水冲刷
			临时排水沟	2023年3月5日	2023年3月5日	m	164		收集项目区雨水
			临时沉砂池	2023年3月5日	2023年3月5日	座	1		沉淀雨水中的泥沙
			临时拦挡	2023年3月4日	2023年3月4日	m	64		保证临时堆土稳定
