

证书等级：★★★★

ISO9001:2015 质量体系认证

证书编号：水保监测(鄂)字第 20220006 号

注册号：23921Q00089R0S

荆州市长江涵闸除险加固工程颜家台闸

水土保持监测实施方案



建设单位：江陵县城市与乡村投资发展集团有限公司

编制单位：湖北绿源工程设计有限公司

2025年7月



生产建设项目水土保持监测单位水平评价证书
(副本)

单位名称：湖北绿源工程设计有限公司

法定代表人：张艳艳

单位等级：★★★★ (4星)

证书编号：水保监测(鄂)字第20220006号

有效期：自2022年12月01日至2025年11月30日

发证机构：中国水土保持学会

发证时间：2022年12月



仅供荆州市长江涵闸除险加固工程颜家台闸使用

项目名称：荆州市长江涵闸除险加固工程颜家台闸

文件类型：水土保持监测实施方案

编制单位：湖北绿源工程设计有限公司 (签章)

法定代表人： (签章)

单位地址：宜昌高新区发展大道57号6栋2单元9001号

联系方式：13308600175 0717-6299982

荆州市长江涵闸除险加固工程颜家台闸

水土保持监测实施方案

责任页

湖北绿源工程设计有限公司

批 准：张艳艳（总经理）

核 定：黎 明（高级工程师）

审 查：毛广维（工程师）

校 核：王玉姣（工程师）

项目负责人：王 翔（工程师）

编 写：王 翔（工程师）（第一章至第三章）

王博文（工程师）（第四章至第六章）

目 录

1	前言	1
1.1	任务由来及方案编制情况	1
1.2	监测目的	2
1.3	监测原则	2
1.4	方案编制依据	3
2	建设项目及项目区概况	5
2.1	项目概况	5
2.2	项目区概况	6
2.3	水土流失防治布局	10
2.4	施工现场调查	14
2.5	施工现场评价	17
3	水土保持监测布局	18
3.1	监测目标和任务	18
3.2	监测范围和分区	18
3.3	监测重点和布局	19
3.4	监测时段和工作进度	21
4	监测内容和方法	23
4.1	施工准备期	23
4.2	工程建设期	23
4.3	试运行期	30
5	预期成果及形式	32
5.1	监测记录表	32
5.2	水土保持监测报告	32
5.3	图片影像资料	34
5.4	附件	35
6	监测工作组织与质量保证	36

6.1	监测项目部及人员组成	36
6.2	监测质量控制体系	37
6.3	监测工作安排	41

附表:

附表 1: 生产建设项目水土保持监测季度报告表

附表 2: 开发建设项目工程建设区域及其分区面积统计表

附表 3: 扰动土地情况监测记录表

附表 4: 临时堆放场监测记录表

附表 5: 简易土壤流失观测场

附表 6: 护坡工程监测记录表

附图

附图 1: 水土保持监测点位布置图

1 前言

1.1 任务由来及方案编制情况

江陵县因“地临江”、“近州无高山，所有皆陵阜”而得名，位于湖北省中南部、长江荆江段左岸，江汉平原西部，位于荆州城区东南郊，东与监利县、潜江市接壤，西隔长江与公安县相望，南接石首市，北邻荆州市沙市区。介于东经 $112^{\circ}12'52''$ — $112^{\circ}44'22''$ ，北纬 $29^{\circ}54'36''$ — $30^{\circ}16'45''$ ，海拔 25.3—31.0m，东西距 53.5km，南北距 36.2km，总面积 1049km²。

颜家台闸位于长江中游荆江大堤左岸江陵县郝穴境内，荆江大堤（长江干堤）桩号 703+535 处，其主要功能为灌溉。该闸为穿堤拱涵结构，共分 2 孔，单孔净宽 3.0m，孔口尺寸 3m×3.5m，设计流量 37.6m³/s，校核流量 41.6m³/s，1966 年完建，灌溉面积为 37.10 万亩，工程等级为 1 级。

荆州市长江涵闸除险加固工程颜家台闸（以下简称“本项目”）本项目建设是保障国家粮食安全的需要、是实施乡村振兴战略的需要、是保障区域防洪安全的需要、是保障灌区引水需求的需要。可有效保证灌溉期引水安全，提高引水保障能力，切实保障灌区的灌溉供水需求。

综上所述，颜家台闸除险加固工程是十分必要的。

江陵县荆江大堤桩号 703+535 处拆除重建颜家台闸，承担颜家台灌区水源的骨干工程，为颜家台灌区提供水源，满足颜家台灌区的灌溉用水。主要建设内容为拆除重建颜家台闸、堤防加培。

2021 年 11 月，湖北省水利水电规划勘测设计院有限公司完成《荆州市长江涵闸除险加固工程颜家台闸荆州市长江涵闸除险加固工程颜家台闸初步设计报告》并通过审查，湖北省发展和改革委员会于 2022 年 5 月 25 日对本工程进行批复（鄂发改审批服务〔2022〕190 号）。

2022 年 11 月 17 日，湖北省水利厅组织有关单位和专家对湖北省水利水电规划勘测设计院有限公司编制的《荆州市长江涵闸除险加固工程颜家台闸水土保持方案报告书》进行了技术评审。

2022 年 12 月 19 日，本工程取得湖北省水利厅（鄂水许可〔2022〕251 号）关于荆州市长江涵闸除险加固工程颜家台闸水土保持方案的复函。

荆州市长江涵闸除险加固工程颜家台闸实际于2023年11月开工,计划2025年9月完工,工期23个月。

2025年7月湖北绿源工程设计有限公司(以下简称“监测单位”)受江陵县城市与乡村投资发展集团有限公司委托,承担荆州市长江涵闸除险加固工程颜家台闸水土保持监测工作的相关事宜,监测单位于2025年7月25日至28日对工程现场进行全面踏勘和详细调查,并于2025年7月完成了本工程水土保持监测实施方案。

1.2 监测目的

按照有关建设项目水土保持法规及技术规范,在建设项目施工期间和运行期间,为了保护项目建设区的水土资源,有效控制项目建设过程中人为水土流失,需对建设项目防治责任区的水土保持情况进行监测。其目的是:

1、协助建设单位落实水土保持方案,加强水土保持设计和施工管理,优化水土流失防治措施,协调水土保持工程与主体工程建设进度;

2、及时、准确掌握项目建设水土流失状况和防治效果,提出水土保持改进措施,减少人为水土流失;

3、及时发现重大水土流失危害隐患,提出水土流失防治对策建议;

4、提供水土保持监督管理技术依据和公众监督基础信息,促进项目区生态环境的有效保护和及时恢复;

5、为本工程水土保持工程专项验收及同类项目水土保持方案编制水土流失预测提供依据。

1.3 监测原则

根据《生产建设项目水土保持监测规程(试行)》(2015年6月)和项目建设水土流失的特点,本次水土保持监测工作布置和安排遵循以下基本原则:

1、全面调查监测与重点观测相结合的原则

本工程为涵闸除险加固工程,水土流失具有点型分布的特点。只有通过全面调查监测,才能掌握工程整体的水土流失及防治状况,通过全面调查了解对该项目施工过程中的水土流失及防治措施的动态变化,按照施工进度对扰动地表面积进行分段不重叠累加,准确界定本工程的水土流失防治责任范围。重点监测即对特定地段以及典型地段进行连续监测,主要针对不同扰动类型的侵蚀强度监测、

特殊地段及突发事件监测。

2、分区布设监测点的原则

根据水土流失防治分区、水土流失预测结果和水土保持防治措施总体布局，确定监测的重点区域。本工程水土保持监测，每一级分区均布设监测点，同时必须能够代表监测范围内水土流失状况，可以反映整个项目建设的共性情况。

3、以扰动地表监测及不同扰动类型侵蚀强度监测为中心的原则

闸站工程区、渠道工程区、围堰工程区、堤防加培工程区、临时堆土场区、土料场区、施工道路区和施工生产生活区等场地呈点状分布，不同工程单元水土流失量大小取决于流失范围、流失强度、流失历时以及水土保持防护措施实施情况。以不同扰动类型为基础，界定不同扰动类型的面积，以确定本工程的防治责任范围，再结合重点监测成果确定各扰动类型的侵蚀强度，从而获取水土流失总量。

4、监测内容、监测指标、监测方法相对应的原则

不同的工程单元水土流失特点不同，本工程水土保持监测对不同的工程单元确定水土保持监测内容，在内容确定的基础上获得了能够反映监测内容的具体指标，并对每项指标进行监测方法的设计，方便水土保持监测的实际开展，确保通过监测能够客观反映各防治区水土流失特点以及水土保持措施实施后的效益。

1.4 方案编制依据

- 1、《水土保持生态环境监测网络管理办法》（2014年8月19日水利部第46号令）；
- 2、《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》(GB/T 22490-2008)；
- 3、《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）；
- 4、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）；
- 5、《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（2015年6月）；
- 6、《水土保持试验规程》（SL419-2007）；
- 7、《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；
- 8、《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453.1~16453.6-2008）；
- 9、《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）；
- 10、《生产建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2016）

11、《荆州市长江涵闸除险加固工程颜家台闸水土保持方案报告书》（湖北省水利水电规划勘测设计院有限公司，2022年11月）；

12、《荆州市长江涵闸除险加固工程颜家台闸荆州市长江涵闸除险加固工程颜家台闸初步设计报告》（湖北省水利水电规划勘测设计院有限公司，2021年11月）。

2 建设项目及项目区概况

2.1 项目概况

2.1.1 地理位置

颜家台闸位于长江中游荆江大堤左岸江陵县郝穴境内，荆江大堤(长江干堤)桩号 703+535 处，地处江汉平原腹地，北纬 29°59'35.66"，东经 112°25'49.80"，地处江汉平原的四湖流域中区上游，是湖北省四湖流域引长江水源的灌溉闸之一。项目地理位置图详见图 2-1。

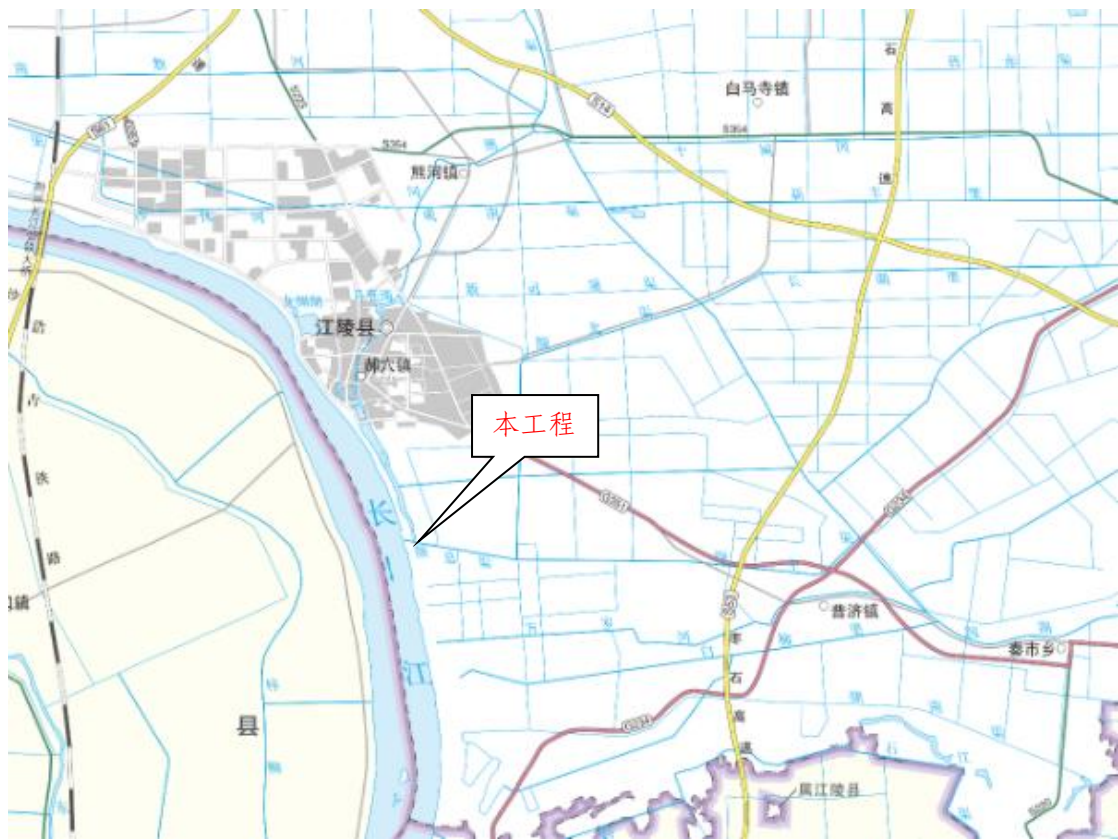


图 2-1 项目地理位置图

2.1.2 项目基本情况

项目名称：荆州市长江涵闸除险加固工程颜家台闸

建设性质：除险加固

建设单位：江陵县城市与乡村投资发展集团有限公司

设计单位：湖北省水利水电规划勘测设计院有限公司

监理单位：湖北华傲水利水电工程咨询有限责任公司

施工单位：湖北华夏水利水电股份有限公司

所属流域：长江流域

建设地点：湖北省荆州市江陵县

工程占地及土石方平衡：本工程占地面积 8.97hm²，其中永久占地 4.31hm²，临时占地 4.66hm²。工程占地类型主要为旱地、水工建筑物用地、沟渠、草地。本工程土石方开挖总量为 10.85 万 m³，填方 9.72 万 m³，借方 3.68 万 m³，余方 4.81 万 m³。

建设规模及内容：本工程为涵闸除险加固，闸站为 I 等工程，主要建筑为 1 级，次要建筑物为 2 级。项目建设内容包括：

闸站工程区：主要由进水渠、闸室、穿堤箱涵、消力池、海漫、出水渠、进出口岸墙等；

渠道工程区：主要由进水渠和出水渠组成；

围堰工程区：外江围堰、内河围堰；

堤防加培工程区：堤防加培区先进行清基处理，清表完成后开始进行回填，回填采用自卸汽车拉土，推土机平整，分层碾压成型，待堤防填筑至设计高度开始削坡；

本工程临时工程主要由临时堆土场 1 处、土料场 1 处、施工道路 1.45km 和施工生产生活区 1 处组成。

工程投资：总投资为 5796.91 万元，其中土建投资 3732.18 万元。

施工工期：项目于 2023 年 11 月开工，计划 2025 年 9 月完工，工期 23 个月。

2.2 项目区概况

2.2.1 地貌

荆江是长江出三峡后的一段平原河流，上起湖北枝城，下至湖南城陵矶，全长 338km。其中枝城至藕池口段，称上荆江，长 168km，属微弯型河段，历史记载古今流路略同，河势相对稳定。藕池口至城陵矶段，称下荆江，长 170km，属蜿蜒性河段，自然裁弯频繁，南北摆动达 20km，素有“九曲回肠”之称。

工程区荆江大堤就全面坐落在广阔的冲积平原上，沿江而下，地势由高渐低，万城至卡子口一段，地面高程 35—28m，相对高差 7m。卡子口至半路堤段，地面高程 28—26m（低洼处仅 24.5m），相对高差 2m。

颜家台闸位于荆江大堤桩号 703+535 处，堤外滩宽约 100 余米，地面高程

为 35.0~36.37m。堤内平台宽 50m，平台高程 32.5~34.0m。距内堤脚 85m 左右，有一条与大堤平行的落淤渠，渠底高程 31m。堤内为广阔的冲积平原，地面高程 29.6~30.6m，地势平坦。项目区地貌类型为平原。

2.2.2 工程地质

工程区位于新华夏系第二沉降带江汉一级沉降区江汉盆地，江汉盆地隶属扬子准地台之两湖断拗带，是白垩纪下陷形成的内陆盐湖盆地。测区自白垩纪以来，新构造运动表现为以沉降为主的间歇性掀斜式升降运动，江汉盆地四周受 NNW、NE 及 NWW 向区域构造控制，内部虽发育有众多的 NNW 和 NE 向断裂，但绝大多数规模不大，切割深度有限，没有发生强烈地震的构造环境，地壳稳定性较好。

2.2.3 气象

根据《中国气候区划名称与代码气候带和气候大区（GB/T 17297-1998）》，项目区属北亚热带季风湿润气候区，具有四季分明，热量丰富，光照适宜，雨水充沛，雨热同季，无霜期长等特点。

项目区年平均气温 16.0℃，极端最低温度-19℃，极端最高温度 39.2℃。无霜期 246d，多年平均降水量 1130mm，多年平均蒸发量为 1174.7mm，年日照时数 1827h，年均积温（ $\geq 10^{\circ}\text{C}$ ）5710℃。多年平均风速 2.2m/s，夏季多为东南风，冬季多为北风或偏北风，历年最大风速 7.8m/s。

根据《湖北省暴雨统计参数图集》（湖北省水文水资源局，2008 年）计算，项目区 10 年一遇 1h 最大降雨量为 74.25mm，10 年一遇 24h 最大降雨量为 185.9mm，20 年一遇 1h 最大降雨量为 89.10mm，20 年一遇 24h 最大降雨量为 220.3mm。。项目区气象特征表见表 2-1。

表 2-1 本工程区气象特征表

序号	气象要素	单位	江陵县	备注
1	多年平均年降水量	mm	1130	1981~2019 年统计
2	多年平均蒸发量	mm	1174.7	
3	多年平均气温	°C	16	
4	极端最高气温	°C	39.2	
5	极端最低气温	°C	-19	
6	年积温 (≥10°C)	°C	5710	
7	无霜期	d	246	
8	多年平均相对湿度	%	77	
9	历年最大风速	m/s	7.8	
10	多年平均风速	m/s	2.2	
11	多年平均日照时数	h	1827	
12	最大冻土深度	cm	2	
13	10 年一遇最大 24h 降雨量	mm	185.9	根据《湖北省 暴雨统计参 数图集》 (2008 年) 查表计算
14	20 年一遇最大 24h 降雨量	mm	220.3	
15	10 年一遇 1h 最大降雨量	mm	74.25	
16	20 年一遇 1h 最大降雨量	mm	89.10	

2.2.4 水文

颜家台闸位于荆江大堤(长江干堤)桩号 703+535 处,地处江汉平原腹地,北纬 29°59'35.66",东经 112°25'49.80",地处江汉平原的四湖流域中区上游,是湖北省四湖流域引长江水源的灌溉闸之一。

四湖流域地处长江、汉水之间,介于东经 112°00'-114°00'、北纬 29°21'-30°00'之间,因境内有长湖、三湖、白鹭湖和洪湖四大淡水湖泊而得名。流域地跨荆州、荆门、潜江三市,是江汉平原重要的组成部分。流域西以沮漳河下游左堤为界,北抵漳河总干渠、三千渠,东接汉江、东荆河右堤,南临长江。四湖全流域地形趋势西北高而东南低,周边高,而中间低,总干渠纵贯中间低洼地带。流域面积 11547km²,其中内垸面积 10375km²。四湖流域是湖北重要的农业生产基地之一。

四湖流域水系复杂、河网纵横,根据其排灌特点分为上、中、下三大排区。其中上区包括长湖、田关河以上地区,汇流面积 3240 km²。长湖、田关河以下,洪湖、下新河、排涝河以上区域为中区,汇流面积 5980 km²。下区包括洪湖、下新河、排涝河以下地区,汇流面积 1155 km²。流域水系以四湖总干渠以及西干渠、东干渠、田关河、螺山干渠和排涝河为输水骨干,总干渠上承长湖来水,沿途接纳两岸洪涝渍水,后经洪湖调蓄,或经高潭口、新滩口、螺山等闸站排入东荆河

或长江。

颜家台闸为颜家台灌区的主要水源工程，颜家台灌区范围包括江陵县的白马寺镇、普济镇、秦市乡、熊河镇、沙岗镇、郝穴镇 6 个乡镇，灌区自然面积 426.92km²，耕地面积 45.26 万亩，设计灌溉面积 40.80 万亩，现状有效灌溉面积 37.59 万亩。长江流经灌区的西南部，荆江大堤是灌区的防洪屏障。灌区内天然或人工河流、沟道多呈东或东南流向，小型沟道交错。四湖流域的西干渠呈西北—东南走向从灌区的中间穿过，是灌区的主要排水承泄区；灌区东部的五岔河是另一条主要的天然排水沟道，经监利县向东汇入四湖总干渠；灌区北部的十周河连接西干渠和五岔河，兼有分流西干渠洪水、截流灌区北部涝水入总干渠的作用。此外，灌区内还有万岁河、白柳渠、十里长渠等较大的河渠，均起除涝排水作用。

2.2.5 土壤

项目区附近土壤类型有潮土和水稻土。潮土为壤土型灰潮土，成土母质为近代河流冲积物。土壤一般发育较好，表层土壤较为深厚（20cm 以上），质地适中，多为全层均质，团粒结构发达，通气透水性能好，土壤干湿易耕好种，施肥反应快，肥劲稳而足。水稻土为潴育型水稻土中的灰潮土田，多出现于湖滨地带，远离河床阶地，处地平缓、排灌条件好，便于机械耕作。灰潮土田成土母质为富含游离碳酸钙的河流冲积物或湖积物，耕作层重壤或粘土，碎块状，稍松或较紧根系密集。。

表 2-2 本工程区主要土壤理化性状一览表

土壤类型	土壤容重(t/m ³)	土壤养分含量						PH 值
		有机质 (%)	全氮 (%)	全钾 (%)	速效钾 (ppm)	全磷 (%)	速效磷	
潮土	1.3	1.71	0.111	2.097	112	0.067	5.9	7.2
水稻土	1.18	2.58	0.11	1.79	99	0.05	6.30	6.90

2.2.6 植被

项目区植物区系属典型亚热带常绿落叶阔叶混交林地带，以常绿阔叶、针叶林及针阔叶混交为主。全区的蕨类和种子植物有 106 科，607 属、1066 种，兼具南方和北方植物区系成分。常绿阔叶林和落叶阔叶林组成的混交林是全区典型的植被类型。主要树种为意杨、樟树等，自然草类主要为白三叶、红三叶、狗牙根等，由于项目区独特的气候条件，植物生长状况良好。项目所在区林草覆盖率约

为 12.98%。

2.3 水土流失防治布局

2.3.1 水土流失防治责任范围

依据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的规定：项目建设单位依法应承担水土流失防治义务的区域包括项目永久征地、临时占地（含租赁土地）以及其他使用与管辖区域。结合本工程经批复的水土保持方案报告书、总体布局及项目特点，确定本工程水土流失防治责任范围面积为 8.97hm²，详见表 2-3。

表 2-3 项目水土流失防治责任范围统计表 单位：hm²

项目分区		占地类型					占地性质		
		耕地	水域及水利设施用地		沟渠	草地	小计	永久	临时
			旱地	建筑物					
主体工程区	闸站工程区		1.08				1.08		
	渠道工程区				0.60		0.60		
	围堰工程区				0.09		0.09	0.09	
	堤防加培工程区			2.63			2.63		
临时堆料场区				1.45			1.45		
土料场区		1.89					1.89	1.89	
施工道路区		0.82				0.17	0.99	0.99	
施工生产生活区		0.24					0.24	0.24	
合计		2.95	1.08	4.08	0.69	0.17	8.97	4.66	

2.3.2 水土保持方案中水土保持措施布局

为达到有效防治水土流失的目的，根据工程总体布置、地形地貌、地质条件等环境状况和各项目建设分区的水土流失特点及状况，本工程的水土保持措施布局按照综合防治的原则进行规划，确定各区的防治重点和措施配置。项目水土流失防治措施将工程措施、植物措施和临时防护措施相结合，形成完整的、科学的水土流失防治措施体系和总体布局。

1、主体工程防治区

(1) 闸站工程区

施工期间基坑坡顶设置有拦水土埂，避免基坑外雨水进入基坑范围内；备用防雨布，雨天对开挖面进行苫盖，防止水土流失，防雨布可重复使用；建筑物基

础处理采用钻孔灌注桩，设置泥浆池，钻渣在基坑内晾干后运至堤防加培工程区堆放；施工结束后回覆表土，对堤防内侧边坡铺设草皮护坡进行绿化。

(2) 渠道工程区

施工前渠道顶部两侧设置临时排水沟和临时沉沙池；施工期间开挖坡面设防雨布苫盖，防止水土流失，防雨布可重复使用；施工结束后，对挡墙以上 3m 的坡面范围内铺设草皮护坡进行绿化，出水渠道口两侧恢复植被。

(3) 围堰工程区

施工期间为防止围堰产生水土流失，设置防雨布苫盖。

(4) 堤防加培工程区

施工前对工程区剥离表土集中堆放，周边采取临时拦挡，表面苫盖密目网及撒播草籽进行养护；周边设置拦挡土埂，土埂外侧设置排水沟，排水沟出口连接沉沙池；加培结束后回覆表土并进行土地平整，根据原占地类型种植意杨恢复植被。

2、临时堆土场防治区

施工前临时堆土场周边设置临时拦挡，拦挡外侧设置临时排水沟及沉沙池；堆土表面苫盖密目网并临时撒播草籽养护；施工结束后进行土地平整，植树种草恢复植被。

3、土料场防治区

施工前对土料场剥离表土集中堆放，对剥离的表土进行临时拦挡和苫盖防护；在土料场周边修建排水沟和沉沙设施；施工结束后，回覆表土，土地平整之后进行复耕。

4、施工道路防治区

施工前，道路占地范围剥离的表土临时堆放于施工道路一侧，临时撒播草籽进行养护，表面苫盖密目网；道路来水侧修建临时排水沟及沉沙池；施工完毕后，碾压层疏松回覆表土并进行土地平整，根据原占地类型恢复植被，占用旱地的部分进行复耕，占用草地的撒播狗牙根草籽恢复植被。

5、施工生产生活防治区

施工场地剥离表土集中堆放，周边采取临时拦挡，表面撒播草籽进行养护，场地四周修建周边临时排水沟及沉沙池；施工完毕后，场地清除硬化层并回覆表土，土地平整之后进行复耕。

本工程水土保持措施总体布局详见表 2-4，水土流失防治措施体系详见图 2-2。

表 2-4 水土保持措施体系表

防治分区	水土流失防治措施体系		
	工程措施	植物措施	临时措施
闸站工程区	表土剥离、表土回覆、截水沟、排水沟	草皮护坡	泥浆池、拦水土埂、防雨布苫盖
渠道工程区		草皮护坡、植树	排水沟、沉沙池、防雨布苫盖
围堰工程区			防雨布苫盖
堤防加培工程区	表土剥离及回覆、土地平整、排水沟、沉沙池、拦挡土埂、	植树种草	袋装土拦挡及拆除、密目网苫盖、撒播草籽
临时堆土场防治区	土地平整	植树种草	排水沟、沉沙池、袋装土拦挡及拆除、撒播草籽、密目网苫盖
土料场防治区	表土剥离及回覆、土地平整、排水沟、沉沙池		袋装土拦挡及拆除、撒播草籽、密目网苫盖
施工道路防治区	表土剥离及回覆（复耕）、土地平整（复耕）、表土剥离及回覆（草地）、碾压层疏松、土地平整（草地）	撒播草籽	排水沟、沉沙池、撒播草籽、密目网苫盖
施工生产生活防治区	表土剥离及回覆、土地平整、硬化层清除		排水沟、沉沙池、袋装土拦挡及拆除、密目网苫盖、撒播草籽

2.3.3 水土流失重点区域和重点阶段

根据批复的水保方案，利用地形图对项目区域进行踏勘，调查本工程在施工准备期、施工期开挖扰动地表和损坏林草植被的情况，在此基础上对项目区各土地类型面积进行量算和统计，本工程扰动原地表面积为 8.97hm²，损毁植被面积 4.25hm²。在不采取防护措施的情况下，通过预测，本工程可能产生的水土流失总量 668t，新增的水土流失量为 528t。施工期可能产生的水土流失量为 509t，自然恢复期可能产生的水土流失量 159t。

本工程建设过程中，主体工程区为本工程水土流失重点防治区，施工期为重点防治阶段。水土流失重点防治阶段主要集中在施工中开挖、回填、临时堆土等。因此，控制扰动范围，优化土石方平衡，能利用的尽量利用，减少弃土量。

2.3.4 水土保持方案中水土流失防治目标

本项目位于南方红壤区，水土流失防治标准采用南方红壤区建设类项目一级标准，并根据项目区自然条件对部分指标进行适当调整：项目区属于湿润气候区，水土流失治理度、林草植被恢复率和林草覆盖率可不作调整；项目区土壤侵蚀强度以轻度为主，土壤流失控制比提高 0.1；项目区属于平原区，渣土防护率不作调整。另由于本项目选址无法避让水土流失重点治理区，林草覆盖率提高 2%。

经调整后的防治指标为：设计水平年水土流失治理度达到 98%，土壤流失控制比达到 1.0，渣土防护率达到 97%，表土保护率 92%，林草植被恢复率达到 98%，林草覆盖率达 27%。详见附表 2-5

表 2-5 南方红壤区一级标准防治指标修正表

防治指标	标准值		修正	采用标准	
	施工期	设计水平年		施工期	设计水平年
水土流失治理度 (%)	-	98		-	98
土壤流失控制比	-	0.9	轻度侵蚀为主的区域，不应小于 1	-	1
渣土防护率 (%)	95	97		95	97
表土保护率 (%)	92	92		92	92
林草植被恢复率 (%)	-	98			98
林草覆盖率 (%)	-	25	位于水土流失重点治理区，拟提高 2%		27

2.3.5 实施进度安排

本工程于 2023 年 11 月 15 开工，进入施工准备期，计划 2025 年 9 月完工，工期 23 个月。截止 2025 年 9 月主体工程已施工完毕，目前仅剩余管理用房进行外墙粉刷施工中。水土保持各项措施的实施进度本着预防为主、及时防治的原则，参照主体工程施工进度，同时结合各防治分区水土流失特点，合理安排。水土保持工程措施、临时措施需结合各项工程的实施进度安排。

2.4 施工现场调查

受江陵县城市与乡村投资发展集团有限公司委托，监测单位于 2025 年 7 月 25 日至 28 日对工程现场进行全面踏勘和详细调查，收集水土保持监测相关资料。监测单位同时成立了水土保持监测小组，对本工程开展监测工作。

监测单位现场调查主要内容有：项目区建设扰动情况、工程进度、弃渣堆土、水土流失及流失危害状况、水土保持措施实施情况以及实施效果等。根据现场踏勘情况来看，本工程属于涵闸除险加固工程，地貌为平原，施工占地包含永久占地：闸站工程区、渠道工程区、堤防加培工程区，临时占地：围堰工程区、临时堆料场区、土料场区、施工道路区、施工生产生活区。占地类型主要为耕地、水域及水利设施用地。通过现场调查踏勘和查阅施工资料发现，本工程于 2023 年 11 月 15 日开工，进入施工准备期，目前，项目主体施工已完毕，堤防已进行恢复，施工生产生活区已拆除进行恢复，堤防加培工程区已种植植被覆盖。

2.4.1 闸站工程区

重建的颜家台闸由进水渠、闸室、穿堤箱涵、消力池、海漫、出水渠、进出口岸墙等建筑物、堤防加培组成。本工程等别为 I 等，主要建筑物，包括闸室、涵洞、渐变段（底板及两侧挡土墙）、消力池（底板及两侧）为 1 级建筑物；其余建筑物为次要建筑物，确定为 2 级。

颜家台闸位于长江左岸江陵县，荆江大堤桩号 703+535 处，自上而下分别为进水渠、闸室、穿堤箱涵、消力池、海漫、出水渠。

根据现场踏勘，闸站工程已完工。



2.4.2 渠道工程区

渠道工程主要为进水渠和出水渠，进水渠位于外江侧，与左侧颜家台泵站的出水池共用。主体设计将左、右岸边坡改为挡土墙与泵站出水池翼墙衔接，均为悬臂式 C30 钢筋砼挡土墙，由直墙段和圆弧段组成。左岸挡土墙总长 65.61m，其中圆弧挡墙长 26.11m，右岸挡土墙总长 53.65m，其中圆弧挡墙长 46.65m。

进水渠渠底圆弧段底宽 12.8~35m，渠底高程 28.40m，采用 10cm 厚 C25 混凝土衬砌，下设 10cm 厚砂石垫层；直墙段渠底采用 50cm 厚 C30 钢筋混凝土护砌，宽 11.96m，下设 10cm 厚 C15 砼垫层。颜家台闸出水为颜总渠，闸后 200m 范围已护砌，根据水下测量资料，海漫段渠道底板高程 28.4~28.80m，需进行适当清淤处理。根据现场踏勘，渠道工程已完工。

2.4.3 围堰工程区

颜家台闸设计为灌溉闸，主要功能是引长江水进行荆州地区的农田灌溉。内河侧为现有灌溉渠，施工期来水通过附近涵闸或泵站导流，内河侧出口消力池施工时用全段围堰挡水。

外江侧主要结构包括防洪闸、箱涵及进口段。进口段与颜家台泵站出水渠连通，在距进口约 10m 处有泵站渠道拍门结构，其顶高程在 31.89m 左右。根据水文计算结果，该结构顶高程低于施工期设计洪水位 33.42m，因而需在外江修建围堰保护基坑施工。

(1) 内河侧

内河侧现有灌溉渠道底高程约 28.5m，渠道两侧岸边高程约 31.5m。考虑施工期间破堤后现有交通被阻断，为确保施工期交通通畅，内河侧围堰顶高程采用渠道两岸地面高程 31.50m，宽 5m。围堰采用均质土填筑，上下游边坡 1:2，围堰填筑/拆除工程量为 1307m³。

(2) 外和侧

由于进口处施工场地条件有限，现有颜家台泵站出水渠道外侧拍门顶高程不足，故考虑在拍门内侧填筑袋装土围堰。围堰顶宽 2m。其中拍门顶部加高部分顶宽 1m，外侧边坡 1:0.5，高度为 1.53m；拍门内侧围堰宽 1m，内侧边坡 1:0.5，高约 5.2m。袋装土填筑/拆除工程量为 2105m³。

2.4.4 堤防加培区

本工程对荆江大堤桩号 703+550~704+427 处堤防进行加培,加培长度 877m,宽度 30m,加培高度约 2.4m,加培土方 4.81 万 m^3 ,来源于本项目余方,占地类型为水工建筑用地(堤路林)。



2.4.5 临时堆土场区

本项目临时堆土主要来自建筑物基础开挖,该部分土方后期将用作回填。主体设计在堤内平台(渠道右侧)处设置 1 处临时堆土场,DT1 临时堆土场主要堆放进出口渠道、闸室和箱涵的开挖料;临时堆土场区占地面积 1.06 hm^2 ,重复占用堤防加培工程区范围内面积,不另外新增占地,主要占用水工建筑用地(堤路林)。

2.4.6 土料场区

本闸重建工程所需土料主要用于基坑回填,需用量不多,工程区基础开挖土料可以作为围堰和回填料。填筑料建议优先考虑开挖料,同时可就近开采,根据现场调查,本项目施工过程中取土主要来源于熊河镇三江村长江外滩,白柳泵站出水渠附近,土料场占地面积 2.03 hm^2 。取土量约 3.00 万 m^3 ,土料场已与江陵县熊河镇人民政府签订征地取土、青苗补偿协议。

2.4.7 施工道路区

1、对外交通

闸址对外交通以公路为主,通过荆江大堤堤顶道路与附近公路交通网相连。工程附近有荆监一级公路 S103 及城镇等级公路经过,此外还有多条县乡级公路,可通往江陵县、荆州市等地。对外交通较为便利。

2、场内交通

场内交通全部采用公路，除充分利用堤顶公路、上堤道路及当地现有的村镇公路根据调查，没有新增施工道路。

2.4.8 施工生产生活区

工程施工生产生活区为方便施工并满足防洪安全考虑，设置在渠道左侧和右侧靠近堤内平台的一处堤路林。区内分为机械修配停放场、钢木加工厂、水泥仓库、综合仓库和生活营地。根据调查施工生产生活区占地面积约 2480m²。其中 SGQ-1 面积约 1680m²，SGQ-2 面积约 800m²。



2.5 施工现场评价

综上所述，就目前施工现场踏勘和调查中所存在的问题归纳和评价如下：

- 1、施工单位在防治水土流失方面采取了部分工程措施、植物措施、临时措施，如表土剥离、表土回覆、植树种草、排水沟、临时排水沟、临时苫盖等，措施较为完善；
- 2、主体工程已完工，建议加强已种植植被养护措施，及时开展水土保持专项验收程序。

3 水土保持监测布局

3.1 监测目标和任务

3.1.1 监测目标

本工程水土保持监测的目标就是通过选择合理的监测内容、完善的监测方法和科学的评价体系，对项目及项目区的水土流失成因、流失量、流失强度变化以及水土保持生态环境建设效益等进行监测，及时掌握工程各区水土流失情况和水土保持方案的实施效果，发现问题能及时处理和解决，为建设单位的水土保持工作服务，以期最大限度地减少对项目区及周边地区生态环境的负面影响，围绕工程水土流失的防治目标，为监测管理机构提供监测基础数据，使得监测管理机构更好的对项目水土流失进行控制，为水土保持专项验收提供依据。因此，水土保持监测是水土流失防治的重要环节之一，对工程施工具有监督作用，对做好项目区水土流失防治工作具有重要的意义。

3.1.2 监测任务

受江陵县城市与乡村投资发展集团有限公司委托，我单位承担了荆州市长江涵闸除险加固工程颜家台闸水土保持监测任务。在接受任务后，我单位成立了专门的水土保持监测项目组，组织技术人员成立监测小组于2025年7月25日至28日对工程现场进行全面踏勘和详细调查，收集水土保持监测相关资料。综合工程建设和水土流失的特点，对本工程主要水土流失部位的水土流失量及影响水土流失的主要因子进行监测，分析各因子对流失量的作用情况，分析水土流失量随时间的变化情况。编制监测实施方案和监测报告，对以后的监测工作具有指导意义，并对减少项目建设期水土流失量，改善区域生态环境具有重要的作用。

3.2 监测范围和分区

3.2.1 监测范围

根据《荆州市长江涵闸除险加固工程颜家台闸水土保持方案报告书》等相关文件要求，结合现场监测踏勘结果，确定本工程的监测范围与水土流失防治责任范围一致，监测范围为8.97hm²。

3.2.2 监测分区

结合工程总体布局、施工时序、占地类型及占用方式，造成的水土流失类型、水土流失的重点区域及水土流失防治目标等工程建设特点和人为活动影响情况，将本工程监测划分为主体工程区、临时堆料场区、土料场区、施工道路区和施工生产生活区等 5 个一级区，将主体工程区划分为闸站工程区、渠道工程区、围堰工程区和堤防加培工程区等 4 个二级区。水土保持监测范围见表 3-1。

表 3-1 水土保持监测范围一览表 单位：hm²

监测分区		监测范围
主体工程区	闸站工程区	1.08
	渠道工程区	0.60
	围堰工程区	0.09
	堤防加培工程区	2.63
临时堆料场区		1.45
土料场区		1.89
施工道路区		0.99
施工生产生活区		0.24
合计		8.97

3.3 监测重点和布局

3.3.1 监测重点

水土流失监测以水土流失严重区域为重点。由水土流失预测结果可知，本工程施工过程中，临时堆料场、施工道路和施工生产生活区水土流失强度较小，而主体工程区和土料场区水土流失强度相对较大，因此施工过程中水土流失强度相对较大的区域是水土保持监测的重点区域。

3.3.2 监测布局

3.3.2.1 监测布局与原则

本工程监测布局与原则应遵循下列条款：

- 1、应充分反应项目所在区域的水土流失特征；
- 2、反应项目工程施工和工程构成特性；
- 3、监测点相对稳定满足持续观测的要求；
- 4、监测点数量满足水土流失及其治理成效评价的可信度要求；

5、重点监测项目区水土保持措施实施进度水土流失动态变化和水土保持措施防治效果；

6、以水土保持监测分区为布局，本工程根据施工工艺形成的典型水土流失侵蚀单元布设各类监测点及监测设施。

3.3.2.2 监测点布设

根据水土保持监测点位布设原则，确定本工程监测点，具体要求如下：

- 1、每个监测点都应有较强的代表性；
- 2、各个观测场应适当集中，不同监测项目宜相互结合；
- 3、宜避免人为活动的干扰；
- 4、交通方便，便于监测管理；
- 5、项目区内类型复杂，分散的工程宜布设简易观测场。

依据监测点确定要求，拟定本工程水土保持监测点位共计 6 处，详见表 3-2。

表 3-2 水土保持监测点位布设一览表

监测分区		监测点位 (处)	监测点位置	监测方法
主体工程 防治区	闸站工程区	1	闸站工程坡面	实地调查法（无人机 遥感监测法、巡查法、 照相法）
	渠道工程区	1	进水渠	
	堤防加培工程区	1	植被恢复区域	
临时堆土场防治区		1	植被恢复区域	
土料场防治区		1	植被恢复区域	
施工生产生活区		1	施工生产生活区，植被恢复区域	
合计		6		

3.3.2.3 监测设备

为准确获取各项地面观测及调查数据，水土保持监测必须采用现代技术与传统手段相结合的方法，借助一定的先进仪器设备，使监测方法更科学，监测结论更合理。如利用全球定位系统（GPS）、全站仪进行动态监测，利用无人机、地理信息系统（GIS）建立动态监测数据库，用水样、土样分析仪器分析典型区域含沙量以及土壤养分等。

本工程水土保持监测设施及仪器设备详见表 3-3。

表 3-3 监测设施设备数量一览表

项目	单位	数量	备注	
监测设备	无人机	台	1	量测挖填、临时堆土等形成的边坡和扰动面积
	手持式 GPS 定位仪	套	1	
	便携式浊度仪	台	1	测量泥沙量
	激光测距仪	台	1	植被调查
	风向、风速、雨量计	套	1	用于监测项目区风向、风速、降雨量
	烘箱	台	1	用于称取水土流失量、泥沙量
	电子天平	台	1	
	标志绳	m	200	用于监测点区域围挡保护
	标示牌	个	5	用于监测点标示
	游标卡尺	把	2	用于植被调查等
	数码相机	台	2	记录影像
	打印机	台	2	成果报告
	扫描仪	台	1	
	复印机	台	1	
	计算机	台	2	记录监测数据、编写报告等
	计算器	台	2	
消耗性材料	测绳	根	2	植被调查
	50m 卷尺	把	2	用于植被调查等
	钢卷尺	把	2	
	测钎	根	45	监测水土流失量
	水桶、铁铲等	批	1	用于水土流失泥沙取样
	量筒量杯	套	3	
	相关处理软件	套	3	编写报告

3.4 监测时段和工作进度

3.4.1 监测时段

本工程属于点性类项目，根据项目建设特点，工程产生水土流失的时间主要集中在施工期。工程完工后，施工活动引发水土流失的各种因素逐渐消失，随时间推移，各项水土保持措施的功能日益得到发挥，工程建设新增水土流失得到控制，并最终达到新的平衡。但在运行初期水土保持措施还不能充分发挥作用时，仍有水土流失发生。本工程工期为 2023 年 11 月开工，计划于 2025 年 9 月完工，总工期 23 个月。

1、施工准备期及施工期：结合各单元工程施工进度安排，确定本工程施工期监测时段为 2023 年 11 月至 2025 年 9 月，监测 23 个月。

2、试运行期（林草恢复期）：由于区域降水量丰富，绿化植被恢复条件良好，结合项目实际情况，考虑项目运行期监测到水平年结束，主要监测水土保持措施实施效果，植物生长状况等，监测时段为即 2025 年 9 月至 2025 年 10 月，监测 1 个月。

3.4.2 工作进度

监测单位人员于 2025 年 7 月 25 日至 28 日进场对项目建设实际情况进行了全面踏勘和详细调查，收集了相关资料并进行了实地测量和监测点选点。进场监测时，主要对项目区建设扰动情况、工程进度、弃渣、水土流失及流失危害状况、水土保持措施实施情况等进行全面踏勘和调查，对工程监测进场前的资料进行收集，项目目前处于建设施工阶段。

本工程水土保持监测工作进度如下：

接受任务→资料收集→前期调查→内业整理→监测设计→实地监测→提交监测阶段性报告→成果整理与分析→提交施工期监测总结报告。本工程水土保持监测工作进度见图 3-1。

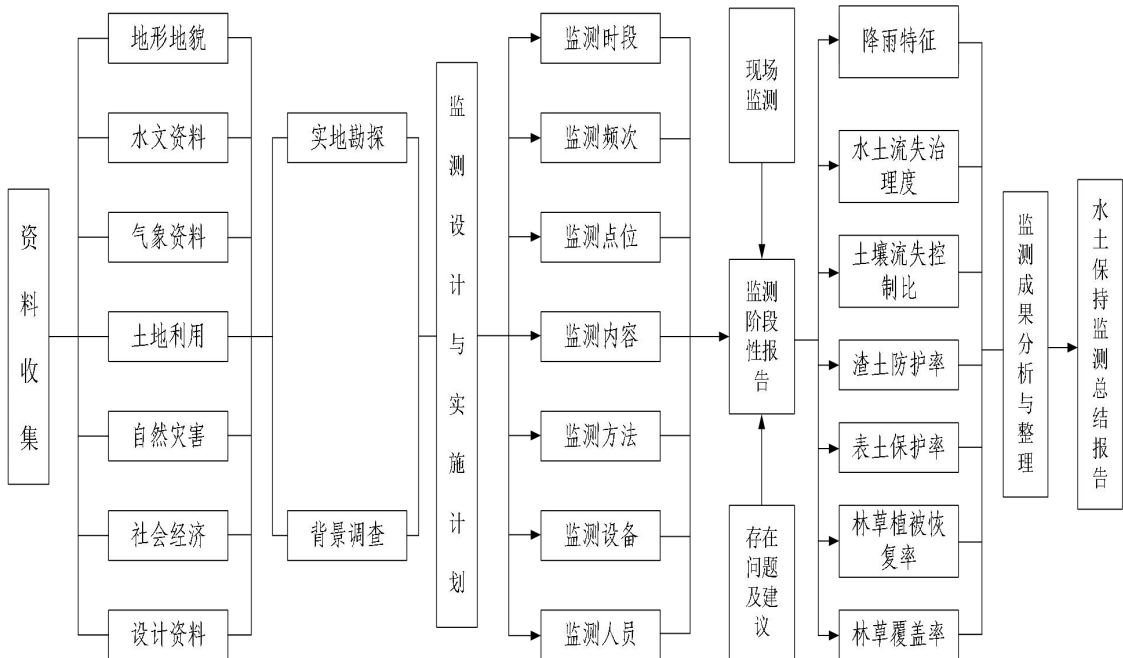


图 3-1 水土保持监测工作进度图

4 监测内容和方法

4.1 施工准备期

监测内容：主要是对监测防治责任范围内的地形地貌、地面组成物质、土壤植被、水文气象、水土流失状况等基本情况进行调查，分析掌握项目建设前项目区的水土流失背景状况。

监测方法：采用实地勘测、线路调查、历史影像资料调查等方法对地形、地貌、水文气象等水土流失因子进行监测。采用设计资料分析，结合实地调查对林草植被覆盖度、水土流失状况进行监测。

4.2 工程建设期

4.2.1 工程建设及扰动土地面积监测

采用资料收集与现场调查相结合的监测方法。

收集项目水土保持方案、初步设计、施工图设计、施工征地、施工进度等资料，作为开展现场调查的参考资料。

采用实地勘测方法，利用高精度GPS和GIS技术，沿工程施工扰动边际进行跟踪作业，测量工程扰动土地范围，并与收集资料进行对比核实，计算工程占用土地面积和扰动地表面积。

查阅设计文件资料，结合实地调查、地形测量分析，通过对比核实，计算工程各施工阶段的挖、填方数量及面积，产生的弃渣量及堆放面积，其中人工开挖与填方边坡坡度、弃渣体高度等采用地形测量法。

4.2.2 水土流失因子监测

项目建设区水土流失因子采用《生产建设项目水土保持监测规程》(试行2015年6月)中规定的调查和量测的监测的方法。

1、地貌、植被的扰动面积、扰动强度的变化

采用实地勘测、地形测量等方法，结合GPS和GIS技术的应用，对地貌、植被的扰动变化进行监测。

2、复核建设项目占地面积、扰动地表面积

采用查阅业主征地文件资料，结合GPS和GIS技术，沿扰动边际进行跟踪作业，结合实地情况调查、地形测量分析，进行对比核实，计算场地占用土地面积、

扰动地表面积。

3、复核项目挖方、填方数量及面积和各施工阶段产生的弃土、弃石、弃渣量及堆放面积

采用查阅设计文件资料，结合实地情况调查、地形测量分析，进行对比核实，计算项目挖方、填方数量及面积和各施工阶段产生的弃土、弃石、弃渣量及堆放面积。人工开挖与填方边坡坡度、土方堆放高度等采用地形测量法。

4、项目区林草覆盖度

采用抽样统计和调查、测量等方法，并结合GPS和GIS技术的应用进行监测，即选择有代表性的地块，分别确定调查地样方，并进行观测和计算。

项目区林草覆盖度利用高精度GPS定位，结合GIS分析技术，采用抽样调查和测量等方法进行监测。即选择有代表性的地块，确定调查地样方，先现场量测、计算郁闭度（或盖度），再计算出场地的林草覆盖度。具体方法为：

（1）林地郁闭度的监测采用树冠投影法。在典型地块内选定20m×20m的样方，用皮尺将标准地划分为5m×5m的方格，测量每株立木在方格中的位置，用皮尺和罗盘测定每株树冠东西、南北方向的投影长度，再按实际形状在方格纸上按一定比例尺勾绘出树冠投影，在图上求出林冠投影面积，即可计算林地郁闭度。

（2）灌木盖度的监测采用线段法。选取面积为5m×5m的样方，用测绳或皮尺在所选定样方灌木上方水平拉过，垂直观察灌丛在测绳上的投影长度，并用卷尺测量。灌木总投影长度与测绳或样方总长度之比，即为灌木盖度。用此法在样方不同位置取三条线段求取平均值，即为样方灌木盖度。

（3）草地盖度的监测采用针刺法。选取2m×2m的样方，测绳每20cm处用细针（φ=2mm）做标记，顺次在小样方内的上、下、左、右间隔20cm的点上，从草的上方垂直插下，针与草相接触即算有，不接触则算无。针与草相接触点数占总点数的比值，即为草地盖度。

（4）林地的郁闭度或灌草地的盖度计算公式为：

$$D = \sum_{i=1}^n \frac{F_i}{F_e} \times 100\%$$

式中：D——林地的郁闭度（或草地的盖度），%；

F_i ——样方面积， $D = \sum_{i=1}^n \frac{F_i}{F_e} \text{m}^2$ ；

F_e ——样方内树冠（或草冠）的垂直投影面积， m^2 。

(5) 项目建设区内各种类型场地的林草植被覆盖度(C)计算公式为:

$$C = \frac{f}{F} \times 100\%$$

式中: C -- 林木(或灌草)植被的覆盖度, %;

F -- 类型区总面积, km²;

f -- 类型区内林地(或灌草地)的垂直投影面积, km²。

纳入计算的林地(或草地)面积,其林地的郁闭度或草地的盖度应大于20%。
样方规格乔木林为60m×20m,灌木林为10m×10m,草地为2m×2m。

4.2.3 取土情况监测

1、取土场

取料期间,重点监测扰动面积、废弃料处置和土壤流失量。取料结束后,重点监测边坡防护、土地整治、植被恢复或复耕等水土保持措施实施情况。

废弃料处置应定期进行现场调查,掌握废弃料的数量、堆放位置和防护措施。

对开挖后形成的边坡,利用工程建设的沉沙池、排水沟等设施进行监测,或量测坡脚的堆积物体积。

2、临时堆土场

临时堆土场重点监测临时堆土场数量、面积及采取的临时防护措施。

在堆土过程中,通过定期调查,结合监理及施工记录,确定堆放位置和面积,并拍摄照片或录像等影像资料,监测水土保持措施的类型、数量及运行情况。

堆土完毕后,调查土料去向以及场地恢复情况。

4.2.4 水土流失状况的监测

水土流失状况的监测包括存项目区的水土流失面积、流失量、程度的变化情况及对周边和下游地区造成的危害及其趋势。通过对《荆州市长江涵闸除险加固工程颜家台闸水土保持方案报告书》预测重点流失区的典型调查和抽样调查,获得现状监测资料,并进行各次监测成果的对比分析,以及与原预测成果的对比。

1、地面监测

工程建设区扰动地表等施工活动引起的水土流失量,以及变化情况,可通过典型调查、沉沙池法、径流小区观测法、简易水土流失观测场法、侵蚀沟法,以及简易坡面量测法等地面观测方法进行监测。本次坡面水蚀量监测主要采用简易水土流失观测场法、侵蚀沟法进行监测。

(1) 沉沙池观测法

利用工程建设中排水沟渠上修建的沉沙池,通过量测沉沙池四个角的泥沙厚度,计算排水渠控制的汇水区域的土壤侵蚀量。计算公式如下:

$$ST = (h_1 + h_1 + h_1 + h_1) \div 4 \times S \times \gamma S \times (1 + X/T)$$

式中: ST——排水渠控制的汇水区域的土壤侵蚀量, kg;

h_i ——沉沙池四角的泥沙厚度, m;

S——沉沙池底面积, m^2 ;

γS ——侵蚀泥沙密度, kg/m^3 ;

X/T——侵蚀泥沙中悬移质与推移质重量之比。

(2) 简易水土流失观测场法

主要适用于取弃土场等分散堆积场地及边坡。布设样地规格为 $5m \times 20m$ 。将直径 $0.5 \sim 1cm$ 、长 $50 \sim 100cm$ 的钢钎,在选定的坡面样方小区按 $1m$ 的距离分上中下,左中右纵横各 3 排,共 9 根布设。钢钎垂直打入地下,使钢钎钉帽与坡面齐平,并在钉帽上涂上油漆,编写编号(图 4-1)。以后,在每次暴雨后和汛期结束,观测钉帽距地面的高度,以此计算土壤侵蚀厚度和总的水土流失数量。计算公式为:

$$A = ZS / 1000 \cos \theta$$

式中: A——土壤侵蚀数量 (m^3);

Z——侵蚀厚度 (mm);

S——水平投影面积 (m^2);

θ ——斜坡坡度。

注意事项:

- 1) 测钎应垂直打入坡面均线;
- 2) 在打入测钎时,应尽量选择周边土质均匀处,避免在大石或其他物质附近打入,影响观测精度;
- 3) 在测量时,应观测测钎左侧及右侧数字,进行平均后计算,不得取测钎上部或下部数字进行计算;
- 4) 观测人员进行量测时,应尽量避免对区内进行破坏,以保证观测数据的合理性;
- 5) 具体计算时,数字偏差对侵蚀模数计算影响较大,读数时应注意估读,

在测尺最小刻度后还应估读一位数。

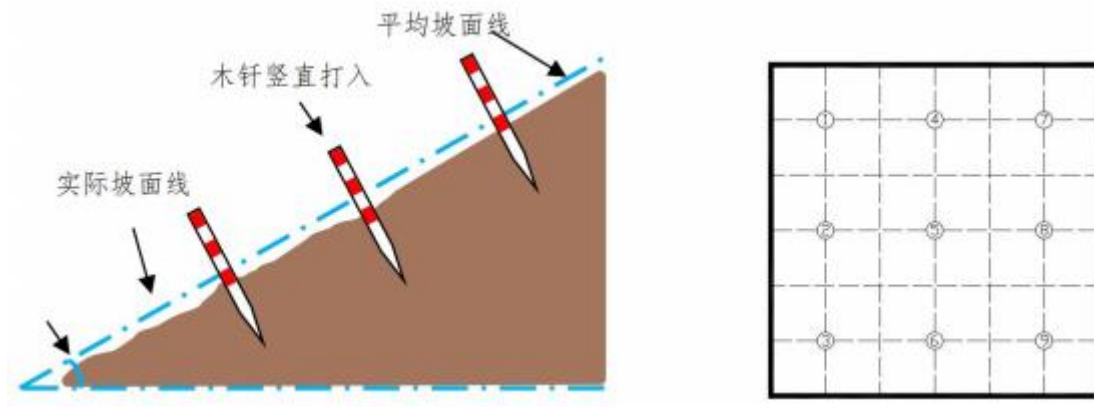


图 4-1 简易水土流失观测场示意图

(3) 侵蚀沟法

在发生侵蚀的坡面上选定样方，测定样方内侵蚀沟的数量和大小来确定侵蚀量。样方大小取 5~10m 宽的坡面，侵蚀沟按大（沟宽 > 100cm）、中（沟宽 30~100cm）、小（沟宽 < 30cm）分三类统计，每条沟测定沟长和上、中上、中、中下、下各部位的沟顶宽、底宽、沟深，推算流失量。计算公式为：

$$W_{\text{总}} = \sum_{i=1}^n X_i \cdot Y_i \cdot L \cdot R_{\text{容}}$$

式中： $W_{\text{总}}$ —— 土壤侵蚀量（t）；

X_i —— 侵蚀沟平均宽度（m）；


Y_i —— 侵蚀沟平均深度（m）；

L —— 侵蚀沟长度；

$R_{\text{容}}$ —— 土壤容重（ kg/m^3 ）；

L —— 样方内侵蚀沟序号；

侵蚀沟样方法通过调查实际出现的水土流失情况推算侵蚀强度。重点是确定侵蚀历时和外部干扰。必须及时了解工程进展和施工状况，通过照相、录像等方式记录、确认水土流失的实际发生过程。监测过程中，定期进行观测测量。

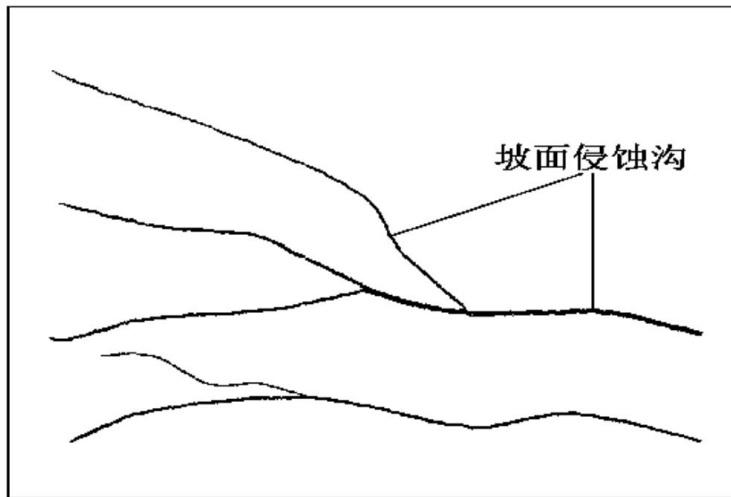

通过量测坡面侵蚀沟的体积，按沟蚀占水蚀的比例（50—70%）计算坡面水土流失量

图 4-2 侵蚀沟观测场示意图

2、调查巡查监测

本工程调查监测法分为普查调查、抽样调查。普查调查适用于面积较小的面上监测项目的调查，并根据需要对水土流失重点单元进行详查，调查内容和方法按《水土保持综合治理规划通则》（GB/T15772-2008）的规定执行。抽样调查适用于范围较大的面上监测项目的调查，由抽样方案设计、现场踏勘、预备调查、外业测定、内业分析等环节组成，按《生产建设项目水土保持监测规程》（试行 2015 年 6 月）的规定执行。场地巡查监测采用定期或不定期方式对工程区水土流失和水土保持情况进行检查。

3、遥感监测

遥感监测是通过遥感信息结合其他地理信息，通过专业处理系统，监测工程扰动面积状况、土壤侵蚀的类型、强度及空间分布状况，以及水土流失防治措施与效果情况，适用于区域水土流失状况监测。遥感监测主要技术内容包括：前期准备、遥感影像纠正处理、外业调查、遥感解译、空间分析、成果复核、数据统计分析等。

4、无人机监测

无人机监测是以项目区平面布置图及区域地形图为基础，利用小微型无人机对监测区范围内进行航拍，获取现场高清影像资料；后期通过专业无人机影像处理软件对航测数据进行解译处理，可以精确计算监测区实际扰动土地面积、堆渣方量、表土剥离量、水土保持措施位置及面积、潜在水土流失量等重要信息。

4.2.5 水土流失造成的危害监测

1、危害面积监测

采用绘图测量的方法，将危害界线勾绘在地图上，量算并平差，计算出受害范围及各种受害对象的面积。

2、危害数量和程度监测

水土流失危害数量通过在工程建设区域及其他危害范围的普查或抽样调查取得。当危害范围较小时，采用普查的方式进行；当危害范围较大，采用抽样调查的方式进行。

水土流失危害程度的监测，包括危害范围受害对象和无害区域对应对象两个方面，通过对比分析相关指标，评价和估算危害大小。

4.2.6 水土保持措施监测

水土保持措施监测采用定期实地勘测与不定期的全面巡查相结合的方法进行，对照水土保持方案及其后续设计资料，对水土保持措施的实施时间、建设地址、数量、规格尺寸、控制水土流失效果进行实地监测，记录、统计并分析水土保持措施完成情况。

4.2.7 生产建设项目水土保持监测三色评价

生产建设项目水土保持监测三色评价是指监测单位依据扰动土地情况、水土流失状况、防治成效及水土流失危害等监测结果，对生产建设项目水土流失防治情况进行评价，在监测季报和总结报告中明确“绿黄红”三色评价结论。三色评价结论是生产建设单位落实参建单位责任、控制施工过程中水土流失的重要依据，也是各流域管理机构和地方各级水行政主管部门实施监管的重要依据。

三色评价以水土保持方案确定的防治目标为基础，以监测获取的实际数据为依据，针对不同的监测内容，采取定量评价和定性分析相结合方式进行量化打分。三色评价采用评分法，满分为 100 分；得分 80 分及以上的为“绿”色，60 分及以上不足 80 分的为“黄”色，不足 60 分的为“红”色。

监测季报三色评价得分为本季度实际得分，监测总结报告三色评价得分为全部监测季报得分的平均值。

生产建设单位要根据水土保持监测成果和三色评价结论，不断优化水土保持设计，加强施工组织管理，对监测发现的问题建立台账，及时组织有关参建单位

采取整改措施，有效控制新增水土流失。对监测总结报告三色评价结论为“红”色的，务必整改措施到位并发挥效益后，方可通过水土保持设施自主验收。

4.3 试运行期

水土保持措施实施效果监测，采用抽样调查的方式进行。对于工程防治措施，主要调查其稳定性、完好程度、质量和运行状况，按照《生产建设项目水土保持监测规程》（试行2015年6月）中规定的方法，并参照《水土保持综合治理规划通则》（GB/T15772-2008）、《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453.1~16453.6-2008）的规定；植物措施主要调查其林草的存活率、生长发育情况（林木的树高、胸径、冠幅）及其植被覆盖度的变化，采用《生产建设项目水土保持监测规程》（试行2015年6月）中规定的方法，参照SL419-2007中第7.1.6条规定的方法。

水土流失防治效果监测主要通过实地调查、抽样调查的方法进行。

水土保持措施的保土效益按照《水土保持综合治理效益计算方法》（GB/T15774-2008）进行；拦渣效益通过量测实际拦渣量进行计算。

1、水土保持防治措施效果监测

全面调查水土流失防治措施，监测项目区水土流失防治措施的数量和质量，如植物措施成活率、保存率和生长情况及覆盖度；工程措施的稳定性、完好程度、运行情况和拦渣蓄水保土效果；开挖、填方边坡的防护情况及稳定情况；耕地恢复面积和恢复质量情况等。

2、水土流失防治六项指标

为项目的水土保持专项验收提供数据支持和科学依据，监测结果应计算出工程的水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土防护率、林草植被恢复率和林草覆盖率六项防治指标值。

1) 水土流失治理度

根据实地调查及资料分析，统计水土流失面积，用水土保持防治措施面积相除，得出水土流失治理度。

2) 土壤流失控制比

根据定位监测的流失量，分析计算各类型区的土壤侵蚀量，计算各区域的土壤流失控制比，采用加权平均方法，计算该工程项目的土壤流失控制比。

3) 渣土防护率

根据调查、量测及统计分析，计算出项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比。

4) 表土保护率

根据调查、量测及统计分析，计算出表土保护量和可剥离表土总量，用表土保护量除以可剥离表土总量即为表土保护率。

5) 林草植被恢复率

根据调查、量测等方法统计出实施植物措施面积，算得植被恢复系数。

6) 林草覆盖率

用已实施的植物措施面积与防治责任范围面积相除，算得植被覆盖率。

5 预期成果及形式

本工程水土保持监测时段为 2023 年 11 月至 2025 年 10 月，共计 24 个月。监测单位于 2025 年 7 月进场开始开展水土保持监测工作。

进场后，根据现场踏勘、资料收集及项目实际情况，编制水土保持监测实施方案，用于设计和指导下一阶段的水土保持监测工作。

每次监测结束后，需对现场各项水保措施实施情况形成反馈意见，及时报送建设单位。若发现异常情况，应立即通知建设单位、当地水行政主管部门，进行补救措施。每季度应按照相关要求完成水土保持监测季度报表，并报送工程建设单位、当地水土保持主管部门备案。

水土保持监测工作结束后，根据各阶段的监测情况，对水土保持监测结果进行总结、分析，编写水土保持监测报告（包括附表、附图、附件等），并协助做好水土保持设施验收工作。

5.1 监测记录表

本工程水土保持监测主要采用现场勘察为主、地面监测为辅的监测方式，每次实地勘察后，对数据进行现场记录，记录内容主要包括：监测点调查、水土流失背景值调查、植被调查、水土保持设施（措施）调查、土壤流失状况调查、水土流失危害调查等；记录的指标主要有：地貌类型、坡度组成、地面组成物质、植物名称、优势树种、平均高度、平均直径、分布状况、生长情况、海拔、坡向、坡位坡度、小气候、土壤质地、地质条件、植被群落、水土保持设施情况等。

5.2 水土保持监测报告

5.2.1 监测实施方案

受建设单位监测工作委托后须对整个工程目前的水土流失状况进行全面的摸底调查。在进场后编制完成项目水土保持监测实施方案和详细计划安排。根据《生产建设项目水土保持监测规程》（试行 2015 年 6 月）的有关要求，项目水土保持监测实施方案须经建设单位同意后实施，并作为开展水土保持监测工作的技术依据。

水土保持监测实施方案包括以下内容：

1、建设项目及项目区概况：包括生产建设项目概况、项目自然、经济和生态环境概况、生产建设项目水土流失防治布局。

2、水土保持监测布局：包括监测目标及任务、监测范围即分区、监测重点及监测布局、监测时段和工作进度。

3、监测内容和方法：包括监测内容（开工之前、施工准备期、工程建设期间、水土保持措施试运行期）、监测指标与控制节点。

4、预期成果及形式：包括数据记录、重点监测图、水土保持监测报告、附件。

5、监测工作组织与质量保证体系：包括监测人员组成、监测质量控制体系。

5.2.2 监测建议书

监测过程中及时以监测意见书的形式向建设单位反映监测过程中发现的主要水土流失问题，并针对发现的问题提出必要的整改建议。监测过程中若发现异常情况，应立即通知建设单位与相关水土保持监测主管部门。

5.2.3 监测季度报告表

水土保持季度报告表。包括以下内容：

1、建设项目概况：包括项目名称、建设单位联系人及电话、填表人及电话、监测项目负责人签字、生产建设单位盖章、主体工程进度。

2、扰动土地面积：包括各工程单元的扰动土地面积、各工程单元合计扰动土地面积。

3、植被占压面积。

4、取土（石）场数量以及取土（石）量。

5、弃渣场数量以及弃渣量。

6、水土保持工程进度：包括工程措施、植物措施、临时措施工程进度。

7、水土流失影响因子：包括降水量、最大 24h 降雨量、最大风速等。

8、水土流失量。

9、水土流失灾害事件。

5.2.4 监测总结报告

监测工作结束后，将监测资料、数据汇总，编制水土保持监测报告，作为水土保持专项验收依据。主要内容包括水土流失监测结果、水土流失危害影响评价、水土保持措施效益分析、结论及建议等。监测总结报告于自然恢复期结束（监测工作结束）3个月内报送相关水行政主管部门。

水土保持监测总结报告。包括以下内容：

- 1、建设项目及水土保持工作概况：包括项目建设概况、水土流失防治工作概况、监测工作实施概况。
- 2、重点部位水土流失动态监测结果：包括防治责任范围监测结果、取土监测结果、弃土监测结果等。
- 3、水土流失防治措施监测结果：包括工程措施及实施进度、植物措施及实施进度、临时防治措施及实施进度、水土保持措施防治效果。
- 4、土壤流失量分析：包括各阶段土壤流失量分析、各扰动土地类型流失量分析。
- 5、水土流失防治效果监测结果：包括水土流失总治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土防护率、林草植被恢复率、林草覆盖率。
- 6、结论：包括水土流失动态变化、水土保持措施评价、存在问题及建议、综合结论。

5.2.5 突发性重大水土流失事件专项监测报告

在工程建设过程中若发生突发性重大水土流失事件，应及时进行现场踏勘，编制突发性重大水土流失事件专项监测报告，对事件进行总结，分析水土流失产生的原因，造成的水土流失情况及水土流失危害。主要监测内容根据时间的不同而不同，通过真实的数据反映现状水土流失情况及水土流失危害。通过对监测结果的分析，指出存在的问题、提出解决的建议。严重水土流失事件专项监测报告应及时送报工程建设单位、当地水行政主管部门。本报告于现场监测完成后一周内提交。

5.3 图片影像资料

在监测的过程中，监测人员将根据水土保持方案设计情况和本监测设计要求进行实地监测，在施工现场收集图片影像资料，用以反映项目区的水土流失及其

治理措施变化情况。每次对施工现场进行监测后，及时整理图片，在水土保持监测季报里反映出施工建设项目在整个施工过程中的水土流失和防治措施状况。

5.4 附件

包括监测数据、图件、影像资料及监测相关文件资料等。

6 监测工作组织与质量保证

6.1 监测项目部及人员组成

6.1.1 监测组织机构

本工程水土保持监测工作由湖北绿源工程设计有限公司承担。为保障本监测工作有序、高效、规范、高质量地完成，监测单位针对项目实际情况设立了监测领导小组，由领导小组统一组织、部署和管理“荆州市长江涵闸除险加固工程颜家台闸”水土保持监测工作。按照工作计划分工，明确监测职责、承担相应的监测任务。

监测单位在成立监测领导机构的同时，组织了一支专业知识强、业务水平熟练、监测设备齐全、监测经验丰富的水土保持监测队伍组建“荆州市长江涵闸除险加固工程颜家台闸”项目部，专人专班，全力以赴做好本工程监测实施方案的制定、审查、前期工作资料的收集和准备工作，以及监测工作的组织、管理、实施、数据处理和汇总、成果审查与上报、信息反馈等各项工作。

本工程监测组织机构职责与任务见表 6-1。

表 6-1 荆州市长江涵闸除险加固工程颜家台闸监测职责分工表

监测单位	工作安排	职责与任务
湖北绿源工程设计有限公司	项目负责人	组织领导，协调各方关系
	技术负责人 (总监测工程师)	编制技术规程、培训，指导与参加地面和调查监测，质量检查，负责组织数据汇总分析和成果报告编制
	现场负责人	制定监测实施方案、监测计划，人员组织与安排，督促实施
	监测工程师	监测数据采集、汇总、数据处理、成果报告编制
	监测员	

6.1.2 监测人员组成

主要监测技术人员配备见表 6-2。

表 6-2 监测人员安排和组织分工

任务分工	姓名	职务/职称	专业	监测工作分工
项目负责人	晏继杰	高级工程师	水利工程	负责项目的组织和协调
技术负责人 (总监测工程师)	毛广维	工程师	水工	负责项目的实施
现场负责人	王博文	工程师	水土保持与荒漠化防治	制定监测实施方案、监测计划，人员组织与安排，督促实施
监测工程师	王翔	工程师	水土保持与荒漠化防治	参加现场监测工作，参与监测方案编制、报告编制和资料处理
监测员	王玉姣	工程师	水土保持与荒漠化防治	

6.1.3 监测机构及监测人员岗位职责

为了保证监测工作科学及时、保质保量地完成，监测工作中已制定完善的管理制度，明确工作机构和人员职责，并做到所有监测技术人员均持有水土保持监测上岗证书。各项目岗位职责见表 6-3。

表 6-3 监测技术人员岗位职责

岗 位	职 责 与 任 务
项目负责人	项目总负责；组织协调各方工作，审定监测计划、监测大纲、监测实施方案、监测技术规程、监测成果报告
技术负责人 (总监测工程师)	技术总负责；组织协调各方技术工作，组织编制和审查监测计划、监测大纲、监测实施方案、监测技术规程、监测成果报告，联络建设单位和施工单位，协助向水行政主管部门报送监测成果，签署有关文件
现场负责人	负责辖区项目实施；组织协调各工作小组，编制监测计划；人员培训与指导，组织开展地面监测和调查监测，质量检查和控制，数据汇总分析，编制监测总结报告初稿
监测工程师	按照分工开展地面监测、调查监测，完成监测任务，数据获取、整理；完成内业数据分析和处理，统计汇总。
监测员	按照分工开展地面监测、调查监测，数据获取、表格填写，整理上报，完成监测任务

6.2 监测质量控制体系

6.2.1 监测工作制度

本工程监测将从监测人员管理、成果质量、成果报送、成果管理、安全等方面建立严格的管理制度。具体如下：

- 1、监测人员必须做到持证上岗；

2、监测人员应按相关技术规范的要求进行采样、监测，监测记录成果必须经过自查并签名，方可上交；

3、监测人员应严格遵守监测资料的保密制度，未经批准，不得私自向外提供监测数据；

4、监测人员应加强监测设施的管理，指定专人对监测设施进行日常巡查管理和维护，确保监测设施在监测期内能正常发挥其功能；

5、监测人员应实行各次监测结果通报制，各次监测结果结束后，监测人员应及时将监测结果向建设单位反馈，以利于建设单位对水土流失防治措施和管理措施的调整，确保水土保持措施发挥最好效果；

6、监测人员要树立良好的职业道德，实事求是，严禁虚报伪造监测数据，不得进行一切有碍监测公正性的交往活动，一经查出，严肃处理；

7、使用仪器前必须先检查仪器设备是否正常，并做书面记录。发现异常或在工作过程中发生故障，应立即报告仪器保管人，查明原因，排除故障后，才可继续使用；

8、监测报告必须经项目负责人签发报出，任何人员不得随意以个人名义或变相形式发表相关监测数据和资料；

9、监测成果应定期、及时报送建设单位，并提醒建设单位正式行文报送各级水土保持部门；

10、往来文件、技术档案由档案资料管理员负责整理、建归档之后，并根据建设单位的要求做好移交；

11、监测人员应加强安全意识，在外业监测期间，保护自身和监测设备的安全。

6.2.2 监测变更控制

由于水土保持监测工作的特殊性，在实际施工过程中，因征地、地质、施工等因素，常常导致实际监测工作将会产生变更，因此，对于该部分应进行详细设计，以指导实际中的监测工作。

1、监测点变更控制

在实际监测工作中，因工程施工进度、实地布设条件不足等情况，均会导致监测点变更。因此，本监测实施方案就监测点发生变更的主要几种情况进行变更

设计。

(1) 施工进度变化导致变更

如因工程施工进度变化,致使监测点不能按照本监测实施方案计划的时间进行布设,则可采取监测点布设时间后延的办法,待施工进度达到监测点布置要求时,方可进行布设。

(2) 布设条件不足导致变更

监测点布设条件不足,主要是指监测设施布置条件不足。不同类型的监测设施,所需要的布置条件不同,由于开发建设项目监测的特殊性,监测设施需要在不干扰工程正常施工的前提下进行布设,这就给监测设施的选址和布设造成了一定影响,因而导致发生变更。

对于监测点变更的控制,主要遵循以下办法进行控制:

1) 布设时间后延:对于布设条件不足的地区,可采取将布设时间推后的办法,待该区域条件成熟后方可布设;

2) 布设地点变更:对于布设条件不足的地区,可以采取在该监测点附近的类似条件地区进行补设的办法进行弥补;

3) 监测设施变更:因监测设施布置的条件不满足的,可采取变更监测设施的方式进行调整,采取另外一种监测方法和设施进行观测;

4) 监测点数量变更:根据项目施工过程中的实际情况,监测点数量可发生变化,监测点数量主要以能尽量全面的反应工程施工过程中造成的水土流失情况为原则进行变更。

(3) 实地水土流失情况变化导致变更

因工程建设过程中的水土流失情况较为复杂,故在监测过程中,监测组将根据工程实际的水土流失变化情况进行监测点的变更。

2、监测时段变更控制

因工程监测滞后原因,导致本工程监测时段发生变化,工程实际的监测时段较监测实施方案发生变化,监测时段应做相应的调整。如遇到特殊情况(工程竣工延期时间较长,导致监测时间加长,监测工作量加大),则由监测单位和业主具体协商解决。

3、监测范围变更控制

因工程征地、占地、扰动及破坏等原因,导致监测范围可能较监测实施方案

设计的防治责任范围有所变化，对于该种类型的变化，在实际工作中的监测范围将以工程实际为主，监测工程建设实际发生的防治责任范围内的水土流失情况。

4、对已开工项目水土流失量、背景值的获取

对于土壤流失量背景值的监测，可以利用数学模型，通过土壤流失因子来推算土壤流失量，如多年平均土壤流失量以及某种给定条件下的土壤流失量。

6.2.3 监测质量控制体系

1、监测单位依据湖北省水利厅批复的《荆州市长江涵闸除险加固工程颜家台闸水土保持方案报告书》，结合工程进度编制完成《荆州市长江涵闸除险加固工程颜家台闸水土保持监测实施方案》，明确工程概况和监测工作目标、任务、内容，制定监测技术和方法、工作程序、工作制度和职责，设立组织机构与调配技术人员，进行监测布局、监测设施和设备配置等设计，落实工作经费等。并按审查后的《荆州市长江涵闸除险加固工程颜家台闸水土保持监测实施方案》定期开展监测工作。

2、优秀的监测队伍是保证监测质量的关键。为了根本上保证监测工作的质量，首先遴选监测经验丰富、技术能力过硬的项目负责人和监测技术队伍，明确职责与分工；其次，所有监测人员必须受训合格后上岗。同时，结合监测任务的特点和特殊性，有针对性的培训本工程监测技术人员。

3、管理制度是规范监测工作、保证监测质量的基础。为了控制和保证监测数据质量，应分析研究制定包括野外观测、图像图形编制、数据整（汇）编、分析总结等各环节的工作制度，建立与监测工作相适应的管理制度，如质量管理与进度控制制度，保证监测工作的进度和成果质量，保证监测成果的准确性；采集数据登记与审查、工作总结制度、工作报告制度、文档管理制度和成果审核等一系列工作制度。

4、落实严格的监测质量保证体系。为确保监测成果质量，根据《湖北绿源工程设计有限公司成果质量管理办法》，对本监测工作和成果质量采取分级负责制，由项目负责人对项目质量负总责，实行项目负责人、技术负责人、现场负责人三级负责制，并在各合同项和各项工作明确具体的工作质量负责人，对数据记录表进行及时分析、处理，所有监测数据必需由项目负责人审核后方可对监测数据进行整编，编制《荆州市长江涵闸除险加固工程颜家台闸水土保持监测报告》。

5、按水利部有关规定，及时分析汇总监测资料，编制监测季度报告，向建设单位报送，并按有关规定协助建设单位向水行政主管部门报送监测季度报告和监测总结报告。

6、与建设单位、施工单位、监理单位紧密联系，保证监测的实效性；及时反馈监测信息，督促和指导水土保持工程的实施、整改和完善。

7、自觉接受水行政主管部门的监督和指导，听取建设单位、监理单位等相关机构对监测工作提出的建议和要求。

6.3 监测工作安排

本工程水土保持监测的范围分区、内容、方法和频次等工作安排，具体见表6-4。

表 6-4 水土保持工作监测安排表

监测时段	监测分区		监测点位布设部位	监测内容	监测方法	监测点编号	监测频次
施工期	主体工程防治区	闸站工程区	闸站工程坡面	水土流失影响因子监测、水土保持措施实施情况监测、水土流失动态变化监测、土壤流失控制比、弃土量、水土流失措施落实情况	实地调查法(无人机遥感监测法、巡查法、照相机)	P1	弃渣、取土、临时堆土的堆土量、实施的水土保持措施建设情况等至少每 10 天监测记录 1 次; 扰动地表面积、水土保持工程措施拦挡效果等至少每 1 个月监测记录 1 次; 主体工程的建设进度、水土流失影响因子、水土保持植物措施生长情况等至少每 3 个月监测记录 1 次。遇暴雨、大风等情况及时加测。水土流失灾害事件发生后 1 周内完成监测。
		渠道工程区	进水渠			P2	
		堤防加培工程区	植被恢复区域			P3	
	临时堆土场防治区	植被恢复区域	P4				
	土料场防治区	植被恢复区域	P5				
	施工生产生活区	施工生产生活区, 植被恢复区域	P6				

附表:

附表 1 生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段: ____年 ____月 ____日至 ____年 ____月 ____日

项目名称			
建设单位联系人及电话		监测项目负责人(签字): 生产建设单位(盖章)	
填表人及电话		年 月 日 年 月 日	
主体工程进度		(工程建设阶段和工程主要组成部分的完成量)	
指 标		设计总量	本季度 累计
扰动土地 面积 (hm ²)	合 计		
	主体工程区		
	弃渣场区		
	...		
植被占压面积(hm ²)			
取土(石)场数量(个)			
弃土(渣)场数量(个)			
取土 (石)量 (万 m ³)	合 计		
	取土场 1		
	取土场 2		
	...		
	其它取土		
弃土 (渣)量 (万 m ³)	合 计		
	弃渣场 1		
	弃渣场 2		
弃土 (渣)量 (万 m ³)	...		
	其它弃渣		
	拦渣率(%)		
水土保持 工程进度	工程措施	合计(处,万 m ³)	处数、方量数分别填写
		拦渣坝(处,万 m ³)	
		挡渣墙(处,万 m ³)	
		...	
	植物措施	合计(处,hm ²)	处数、面积数分别填写
		植树(处,hm ²)	
		种草(处,hm ²)	
		...	
	临时措施	...	
		...	
水土流失 影响因子	降雨量(mm)		
	最大 24 小时降雨(mm)		
	最大风速(m/s)		
	...		
水土流失量(万 m ³)			
水土流失灾害事件		有水土流失灾害事件发生则填写具体内容, 没有则填“无”	
存在问题与建议			

附表2 生产建设项目工程建设区域及其分区面积统计表

工程建设区域及其分区				面积 (hm ²)	实施单位
一级分区	二级分区	三级分区	...		
1 名称				“1 名称”的合计面积	
				“11 名称”的小计面积	
	11 名称	111 名称	...	“111 名称”的面积	
		112 名称	...	“112 名称”面积	
	12 名称	121 名称	...		
		122 名称	...		
	⋮				
2 名称	21 名称				
		211 名称	...		
3 名称	31 名称	311 名称	...		
		312 名称	...		
		313 名称	...		
	32 名称				
		321 名称	...		
...					
合计					

说明：1、工程建设区域分区的数量和级别应根据项目情况确定，具体划分方法见“开发建设项目水土保持监测分区与监测点布局设计”。表中“...”表示下一级分区或下一个分区。

2、“面积”栏按照分区级别从高级别向低级别逐级分解或从低级别向高级别逐项汇总的方式记录和统计，如该栏中第一、第二、第三、第四行的示例。

3、“实施单位”填写对应分区的施工、建设或使用单位的名称。

附表 3

扰动土地情况监测记录表

编号	监测日期	监测分区	扰动情况				整治情况				现场情况	填表人
			扰动形式	扰动面积	扰动前土地利用类型	示意图及尺寸标注	整治方式	整治面积	整治后土地利用类型	示意图及尺寸标注		
1												
2												
3												
...												

填表说明：1、扰动形式主要有挖填、占压；
2、土地利用类型按照 GB/T21010-2017 一级分类填写，主要包括耕地、园地、林地、交通运输用地等；
3、正式方式主要有硬化、土地整治、植物措施等

附表 4

临时堆放场监测记录表

监测日期		堆积时间		监测分区	
位置	经度	地貌类型		监测方法	
	纬度				
堆积物体积	长度 (m)		宽度 (m)	体积 (m ³)	
	高度 (m)		坡度 (°)	坡长 (m)	
堆积物类型		土、石、土石混合等		防治情况	临时苫盖、临时拦挡等
示意图					
备注					

附表 5

简易土壤流失观测场

监测分区名称:

测钎位置和观测对象图示						
观测场地理坐标	东径: E			北纬: N		
观测次数						
测钎 顶端到 地面长度 (mm)	1	2	3	...	n	小计
测钎 1						L1:
测钎 2						L2:
测钎 3						L3:
测钎 4						L4:
测钎 5						L5:
测钎 6						L6:
测钎 7						L7:
测钎 8						L8:
测钎 9						L9:
土壤流失量						
填表说明	1、本表假设测钎的刻度从顶端“0”开始向下延伸，刻度依次增加。 2、“测钎位置和观测对象图标”栏内简洁地画出测钎的相对位置和地面坡度，可以采用数据说明。 3、“土壤流失量”是指在某段时间内流失的土壤质量。					
填表人				核查人		

附表 6


护坡工程监测记录表

监测分区名称:

工程位置 地理坐标	东经: E_____			北纬: N_____		
工程实施 时间	起: 年 月 日			迄: 年 月 日		
护坡 工程形式	<input type="checkbox"/> 削坡开级工程			<input type="checkbox"/> 植物护坡工程		
	<input type="checkbox"/> 工程护坡措施			<input type="checkbox"/> 综合护坡工程		
	<input type="checkbox"/> 滑坡治理工程					
削坡开 级工程	边坡总高度 (m)			边坡平均坡度 (°)		
	级数	级数 1	级数 2	级数 3	...	级数 n
	坡度 (°)					
	主要措施					
	运行状况					
	排水系统					
	其他说明					
植物护 坡工程	边坡总高度 (m)		边坡平均坡度 (°)			
	植物种类					
	盖度 (%)					
	排水系统					
	运行状况					
	其他说明					
工程护 坡措施	边坡总高度 (m)		边坡平均坡度 (°)			
	措施结构与尺寸规格					
	排水系统					
	运行状况					
	其他说明					
综合护 坡工程	边坡总高度 (m)		边坡平均坡度 (°)			
	措施类型	<input type="checkbox"/> 植物护坡	<input type="checkbox"/> 工程措施	<input type="checkbox"/> 削坡开级		
	措施形式	<input type="checkbox"/> 砌石草皮护坡	格状框架护坡			
	参考“削坡开级工程”、“植物护坡工程”、“工程护坡措施”设计相关监测指标。					
滑坡治 理工程	边坡总高度 (m)		边坡平均坡度 (°)			
	治理办法	<input type="checkbox"/> 削头 减载	<input type="checkbox"/> 阻挡地面水		<input type="checkbox"/> 排除地下 水	
		<input type="checkbox"/> 滑坡 体上造林	<input type="checkbox"/> 打滑桩		<input type="checkbox"/> 抗滑墙	
		其他: _____				
	措施结构与尺寸规格					
	排水系统					
	运行状况					
	其他说明					
填表 说明	1、填写本表时, 首先根据实际情况确定“护坡工程形式”, 再填写相关的护坡工程的相关指标, 其他无关的护坡工程及其监测指标不需要在表中出现。 2、“运行状况”, 对于工程措施, 主要内容包括工程是否稳定、是否完好或完好状况、是否有效防止土壤流失等; 对于植物措施, 主要内容包括生长状况、保存率及是否有效防止土壤流失等。					
填表人				核查人		

水土保持监测点位一览表

监测分区		监测点位(处)	监测点位置	监测方法
主体工程防治区	闸站工程区	1	闸站工程坡面	实地调查法(无人机遥感监测法、巡查法、照相法)
	渠道工程区	1	进水渠	
	堤防加固工程区	1	植被恢复区域	
临时堆土场防治区	1	植被恢复区域		
土料场防治区	1	植被恢复区域		
施工生产生活区	1	1处施工生产生活区, 植被恢复区域		
合计		6		

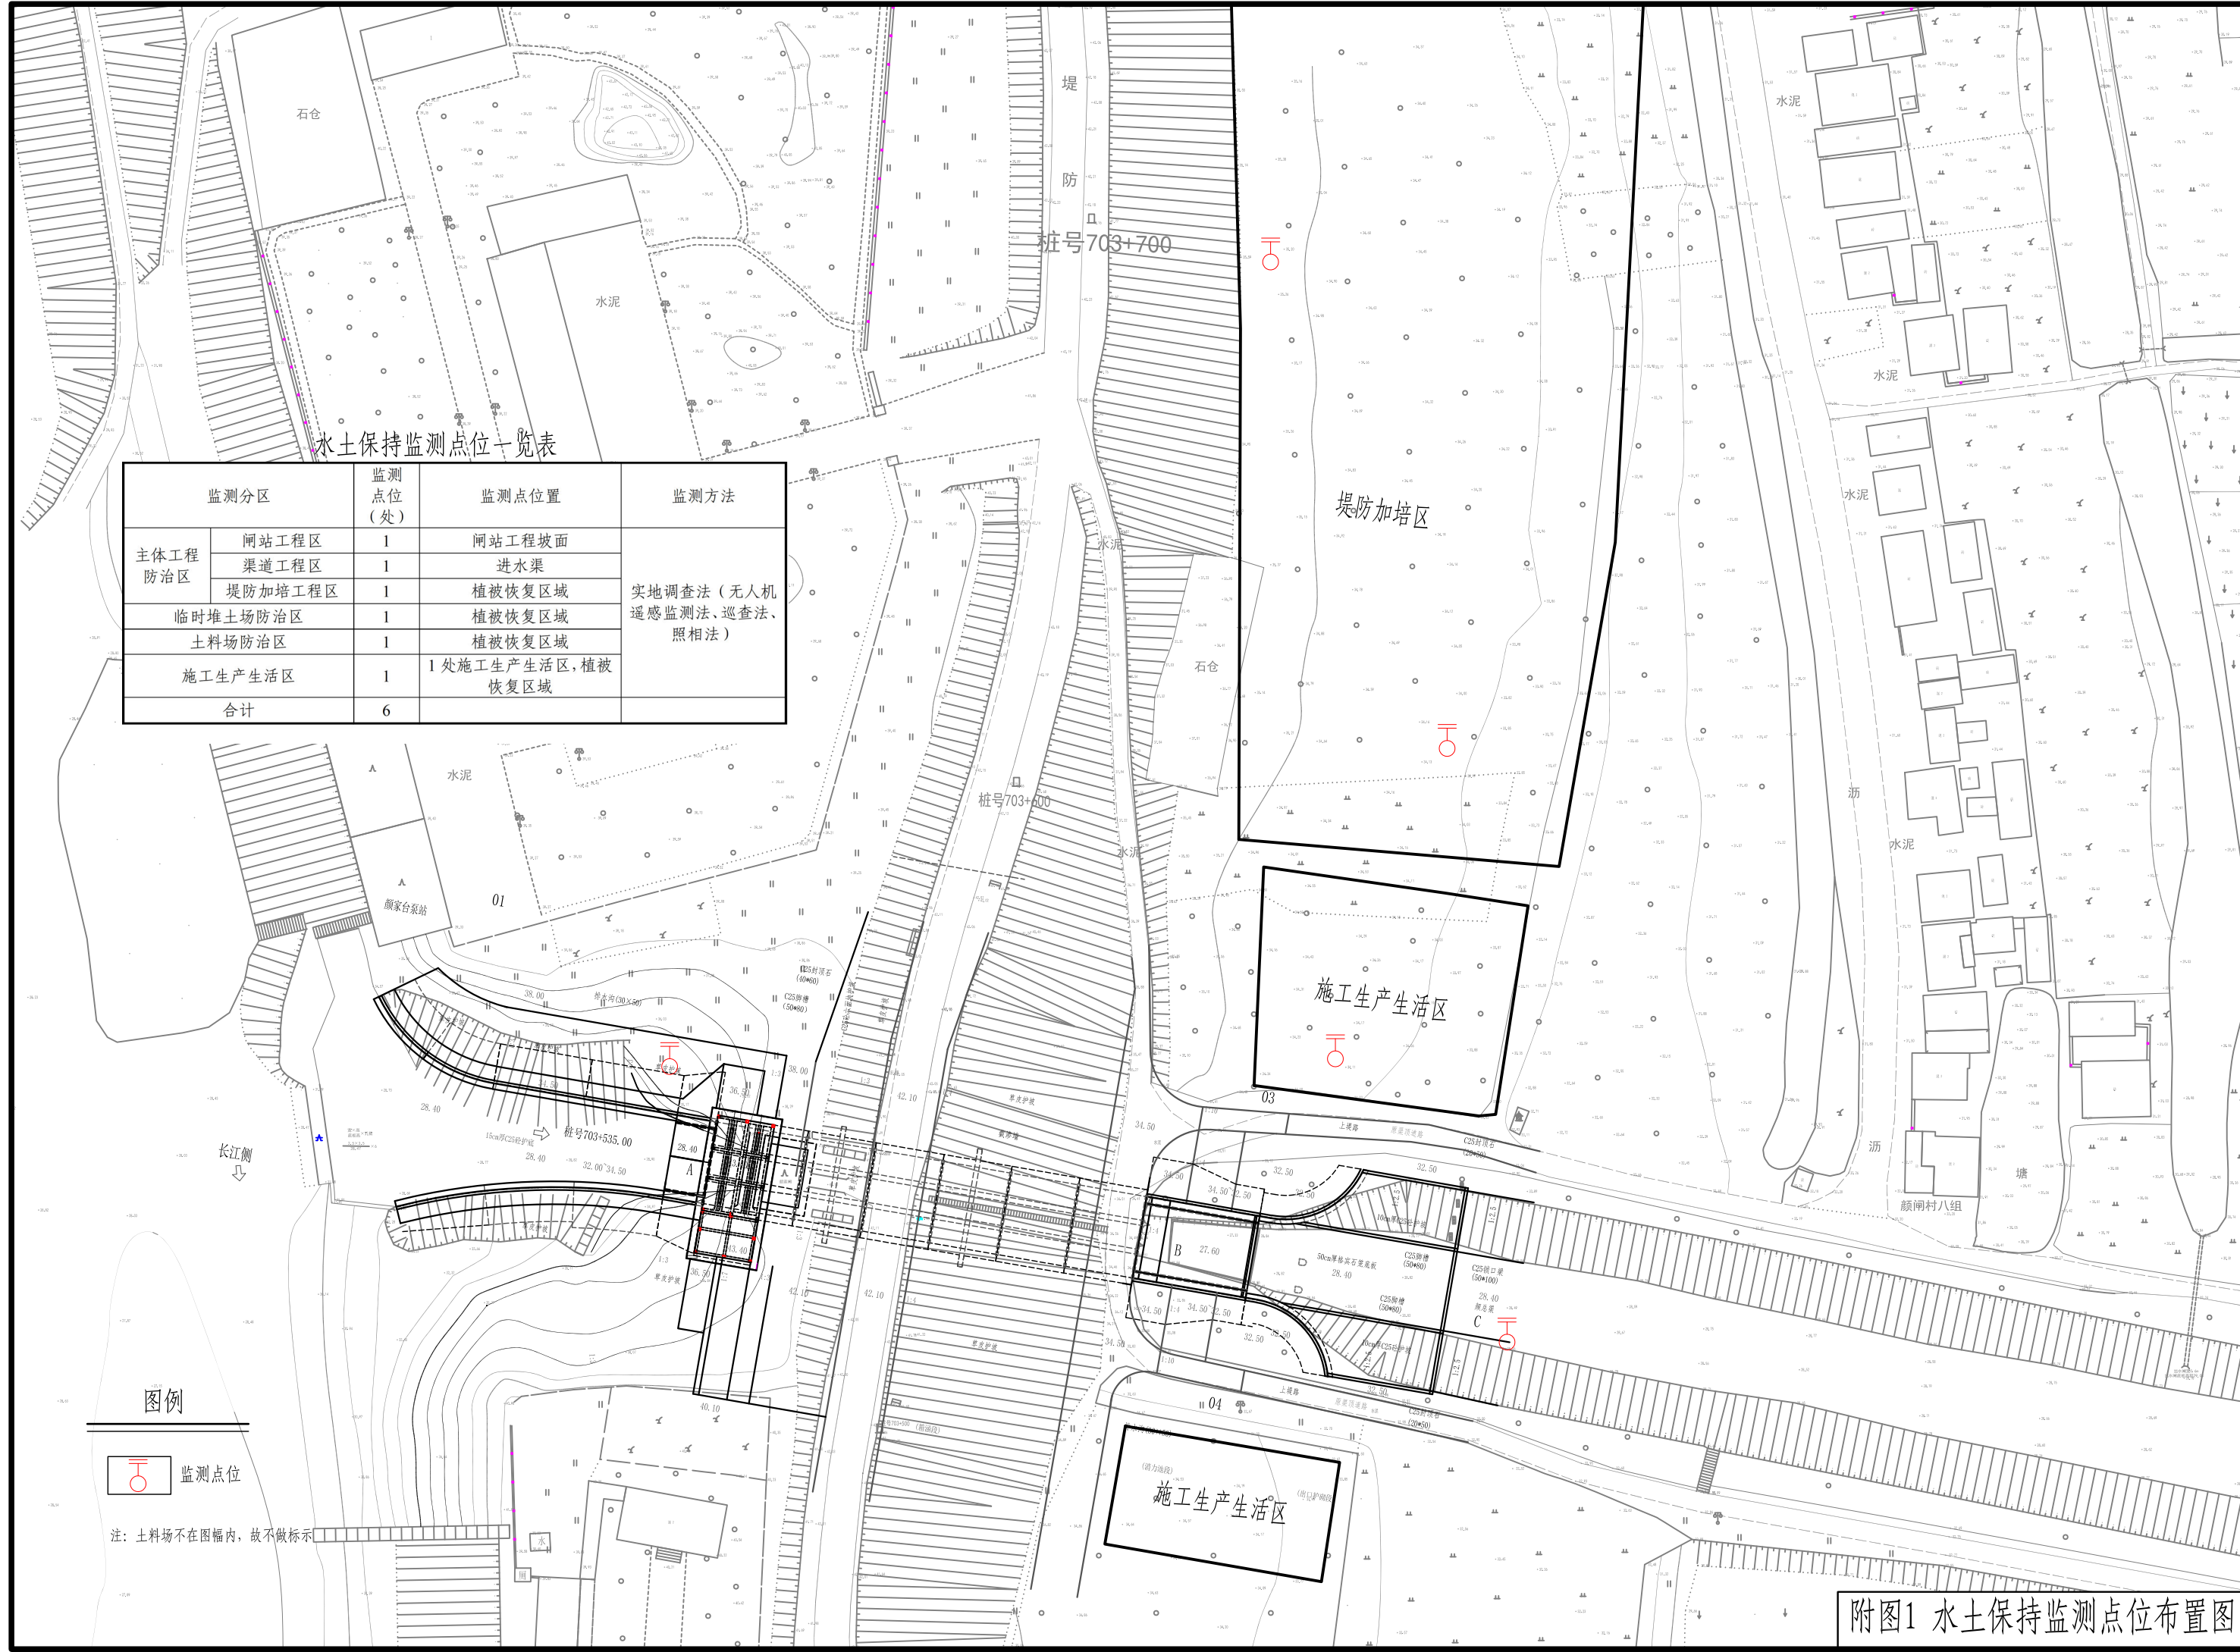

图例



监测点位

注: 土料场不在图幅内, 故不做标示

附图1 水土保持监测点位布置图
